




## 工作團隊



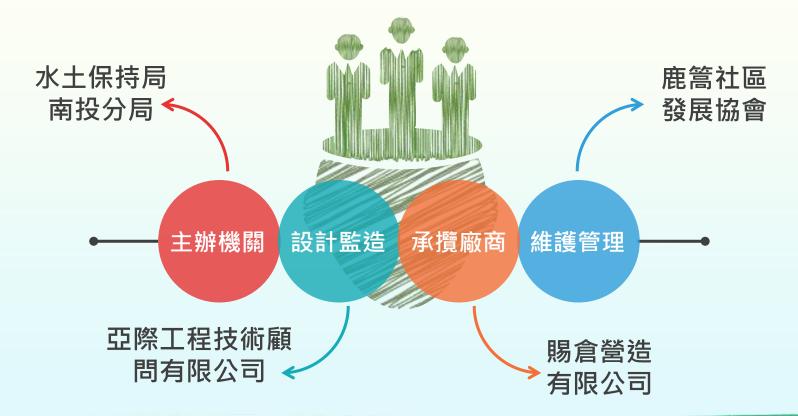

優質·效率·團隊 2

# 簡報綱要



- 壹 工程緣起
- 貳 工程內容
- 参 規劃設計
- 肆 工程特色
- 伍 結語



- 工程位置
- 災因分析



工程位置



行政區域 南投縣魚池鄉

開工日期 109年6月28日

竣工日期 110年4月28日

發包金額 9,511仟元

**結算金額** 10,167仟元

設計監造 亞際工程技術顧問有限公司

施工廠商 賜倉營造有限公司







# 














### 災因分析(3/4)



#### 入流、出流坑溝通洪斷面不足,容易溢流淹水

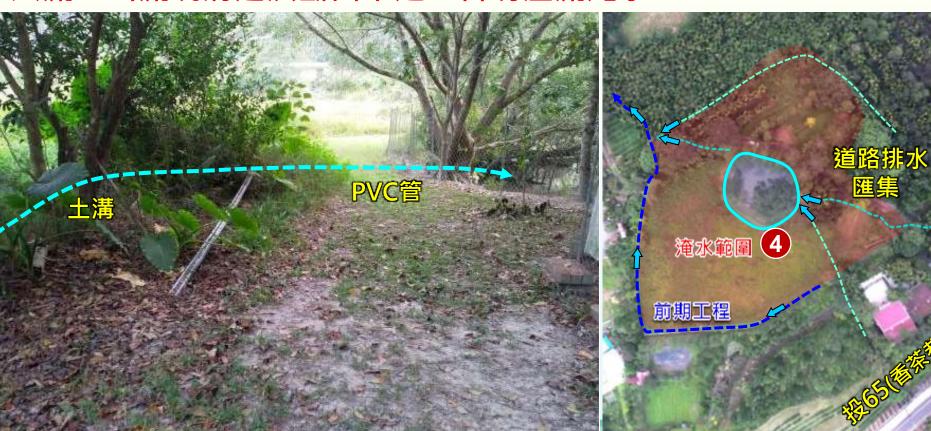



### 災因分析(4/4)

#### SWC8 98A9-07

#### 西側低窪濕地,土地使用性低、窳陋荒廢







- 工程配置
- 變更設計



#### 出入水口改善

- 1 排水箱涵5.6 M
- 2 出流井與緊急溢洪口1座
- 3 入流渠道1座
- 4 引水箱涵4.6M

#### 坑溝整治

- 5 土袋溝18.8M
- 6 護岸70.6M
- 7 固床工5座
- 8 靜水池4座
- 9 砌石溝181.9M

#### 滯洪空間改善

- 10 農塘連通箱涵及水道1座
- 11 植生護坡206M
- 12 維護通道167M
- 13 植栽種植1式

#### 工程配置



· 黄· 效率· 图隊



### 變更設計

次 數	變更後 經費(千元)	變更內容	工期展延
_	11,059	1.農塘施作面積擴大,原設計施作面積1820平方公尺,調整後為2232平方公尺。 2.0K+123.56處既有固床工基礎裸露,將原設計階 梯式固床工調整為靜水池消能設施。	20天
Ξ	10,167	<ul> <li>1.配合現場實際排水狀況,取消施作#1固床工、蓋板 1處及4"透水網管。</li> <li>2.調整清淤便道型式,取消局部原為鋼筋混凝土擋 土設施,變更為自然緩坡。</li> <li>3.增加池體周圍灌木圍籬,原設計為2342株調整後 為7290。</li> </ul>	-

**優質·效率·團隊** 12

# 、規劃設計

- 設計理念 進度管理

- 工程設計 履約管理
- 品質保證
- 維護管理
- 品質管制
- 生態檢核



### 設計理念

	現況問題	治理對策
1	進出水口設施破損、功能不彰	設置入流箱涵及出流井,並於上下池設置連 通箱涵提升防洪能力
2	農塘邊坡局部裸露、滯蓄洪空間不足	緩坡化設計、並規劃滯洪沉砂,具灌溉及滯 洪功能
3	入流、出流坑溝通洪斷面不足	採柔性生態工法並完整規畫排水 <i>,</i> 避免排水 漫流
4	西側低窪濕地,土地使用性低、窳陋 荒廢	既有樹木保留,並種植喬木及灌木誘鳥及誘 蝶,營造友善生態環境
	兼顧安全、經濟生	態及景觀之邊坡治理

優質·效率·團隊 14



### 工程設計(1/7)-水理分析




名稱	數值	說明
集水區面積	1.6公頃	-
計畫洪水量	Qt=0.54cms	-
滯洪體積	890.1m <sup>3</sup> >194.4m <sup>3</sup>	Vp=h/2*(A1+A2) >Vmin=360*Qt
出流口設計	0.6*0.5m	Qout <qt*80% Q<sub>:::</sub> =2.36B<sup>1.13</sup>H<sup>1.53</sup></qt*80% 
滯洪效率檢算	89.67%	(Qt-Qout)/Qt*100% >20%
溢洪口設計	1.2*0.3m	Qover=1.767by <sup>1.5</sup>





### 工程設計(2/7)-排水規畫

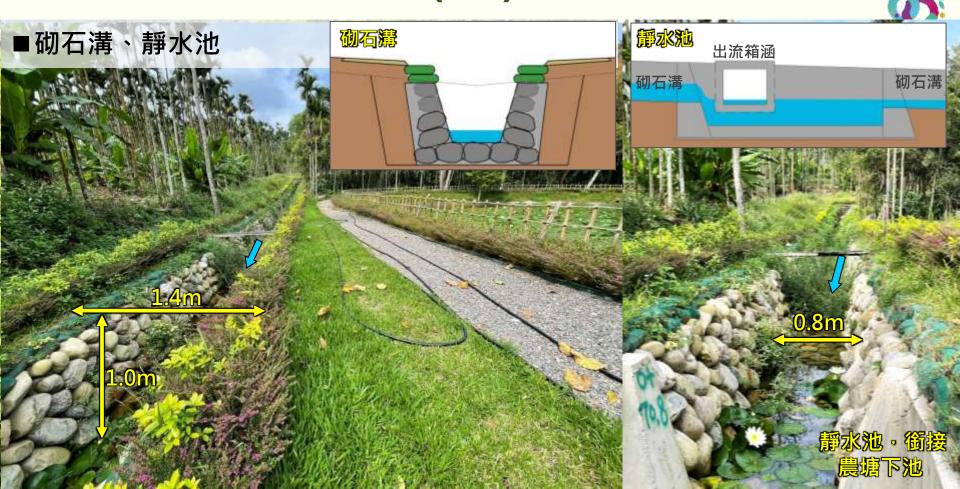



### 工程設計(3/7)-下池





皂土毯 S=1:2~2.5

### 工程設計(4/7)-連通箱涵及維護通道







### 工程設計(5/7)-路面改善









## 工程設計(6/7)-上池







### 工程設計(7/7)-坑溝改善





### 品質保證(1/4)



■ 監造單位組織



監造計畫 負責人 張緯東 技師

負責分局監造計畫業務業務督導

工地監造負責人

陳瑋宗 品管工程師 負責工地施工監告督辦

組員 (監工)

張瑋麟 工程師 負責施工之品質管制 與檢驗等相關事宜

組員 (監工)

林劭峰 工程師


協助施工之品質管制 與檢驗等相關事宜



### 品質保證(2/4)



■ 施工單位組織

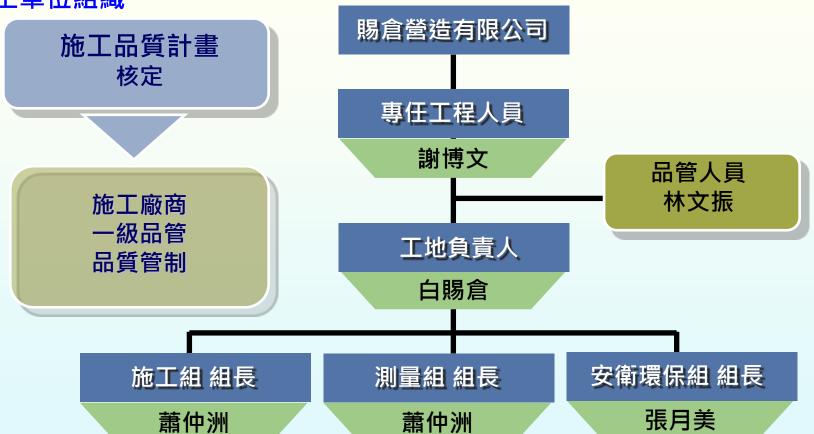

優質·效率·團隊



### 品質保證(3/4)



#### ■ 相關計畫皆於開工(109.6.28)前核定






### 品質保證(4/4)

#### ■ 各項材料均完成送審與試驗



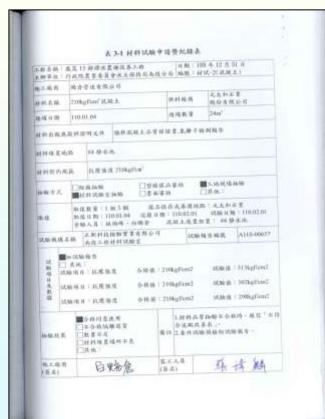



#### 鋼筋抗拉伸試驗



混凝土試體抗壓試驗



# 

	抽查項目	已抽查次數	合格次數	未合格次數	
	放樣工程	10	10	0	
	開挖工程	10	10	0	
	鋼筋工程	8	7	1	
	模板工程	8	8	0	
	混凝土工程	10	8	2	
	回填工程	6	6	0	
	農塘工程	5	4	1	
	砌石溝工程	5	5	0	
	截牆工程	1	1	0	
	固床工工程	4	4	0	
	靜水池工程	4	3	1	
	箱涵工程	2	2	0	
	土袋溝工程	3	3	0	
	混凝土路面工程	2	1	1	
	安全衛生及環境保護	10	10	5	
1530	4鹵 ≐十	1/12	122	11	

## 品質管制(2/4) 監造技師督導檢查並填寫督導記錄表計8次













優質・效率・團隊



# 品質管制(3/4) 共檢查15項工程·計293次

28


#### 施工自主檢查

	檢查項目	已檢查次數	符合次數	未符合次數
	放樣工程	10	10	0
	開挖工程	12	12	0
	鋼筋工程	12	10	2
	模板工程	14	14	0
	混凝土工程	14	12	2
	回填工程	10	10	0
	農塘工程	8	7	1
	砌石溝工程	7	7	0
	截牆工程	1	1	0
	固床工工程	5	5	0
	靜水池工程	6	5	1
	箱涵工程	3	3	0
	土袋溝工程	5	4	1
	混凝土路面工程	3	2	1
	施工作業安全衛生及環境保護	183	176	7
效=	總計	293	278	15

### 品質管制(4/4) 專任工程人員督察並填寫督導記錄表計8次





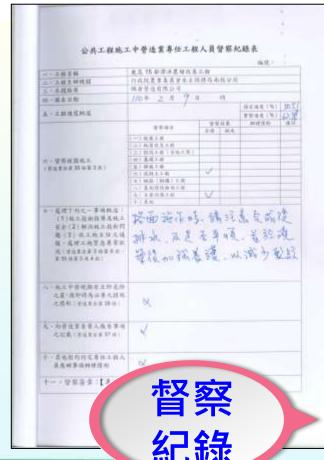

#### 鹿篙15都滯洪農塘改善工程

專任工程人員督察統計表				
項次	督察日期	施工情形		
1	109年8月7日	備料 - 環境整理		
્રટ	109年10月25日	農塘開挖·A投砌石溝		
3	109年11月18日	1段明石溝		
4	109年12月29日	A投謝石溝、靜水池、圖床工		
5	110年1月11日	1、2號靜水池、進水箱減		
<u>6</u>	110年2月9日	路面修進		
7	110年3月11日	竹藤拖竹		
8	110年3月31日	琼堤整理、植栽養護		



#### 進度管理



■ 如期如質完工 開工日期 109年6月28日 竣工日期 110年4月28日

#### 預定與實際進度表



工期

### 履約管理(1/2)



#### ■經1次總局督導,獲得甲等成績(85分),工程品質深獲肯定。

#### 行政院農業委員會水土保持局大工程督等小銀工程公司管等犯録表

= # £ #	(10) 年度型轉性分品物及計畫一份品限员 高級性本工資訊等更度確保規模法:			4.96.R.II	5 T + 18 to	
= 14.5 %	<b>在灰川県市田井</b>	MO SIN		哲学证明	118 9-4 51 16 22	
原原工程 工物規能 (単位)	hizen	放行金額 (十元)	1K 911		超工計劃:199 年4 月 29 日 指述汇工作期:200 日提大	
a##a	技術工程技術 機関を集むる	####	の形土 存扱 何毎円有用 会司	*45.81	metterne	
A.A.	6.0F S.	人用	844	6.4	心场会	
	4. 2. de moit - 43.	196 - Aprile 1	4 - 91 mm	A STATE	in.	

工程网络: 黄蜡橡胶品牌 5,500 年升公司、黄桷唐田 7,700 北方公人: 土地推荐 170 公式、抽碗选择(通過:2000 半十公式、除水准 300 公尺(和1.) 公式 和1.0公式)、除 水溝 辩 公民(申收 形1, 5 公民 )中引 (1, 4 公民) - 则原工 引重一种水池次母( 全砌铁桩 門 打技 ( 在) · 吉州便達護院( 告解收格行及)( 分尺( 和), 多次 施, 和) · 加( 友殊博度 在 ) 图 公式(16-1、分主, 16-1)、人名印土尔·汉特法土在、出水口土桑、维生得商工式、安全管式

學等要責 宋朝朝(土施)、孫明德(北部)、五志林 がほかれ

- 1. 数值任業直開工日飲發完成核充,所工造改完修更新
  - 2. 可用的物质组织基金的研究上的合併。
  - 1. 各项化级专业库存。 4 169 年至月 18 日間工、監查計畫於另見 19 申徵定: 地工計畫、品質計畫於日月 到 百姓工一转长牌三百姓工、有形处管等是施工有损害生土事情的条件。
  - 三 品目哲學什麼完善一項問問題。 4. 文献我型行规缺失即行情知准备:在于挂规。
  - 1. 運用近日過宜施工長股務條約工、通度經濟、提前發揮法山防洪坊院,
  - 1. 施工计畫:品質計畫與工程包括框架
  - 5. 发献社监院理监法工作。 [14] 於假工衛定途施工的畫或品質計畫之事業、核定計畫、屬實各項材料改構機構 及各工項直轄、報本合格項及均量及核工廠商及者、处理正義。
  - 11. 聚联计正比键工作场框
  - 12. 五式的服务服务行政部
  - 13.各式安全衛生事項首有執行处理。
  - 14代 路面中海、獨於我工場合保護、造型損耗利益營費、工管、施則中項其款 11. 排水管置收整件系統

  - 17. 二元相關大輔,以係住代禁稅後,對於主能權健維持者遭用條
  - 15. 實行試體、翻提、機能的合作就定檢檢、均符合規定。

FANS | 4 CC 00 | \$1.7 表展表征實際成立有表稿樣一有全地的機械與《同期生物模質绘像。 100 [13]

等磁线水管池: (0.11,14) (1.3 宝锡梯工场人表:拉工英风梯均由报量 [1.12] [6] [1.1] 所告偿的专用分享由化码只有一架·在其他文件不同:[4.00.00][1] 金衣道: 由禁印证住 (4.03.06) \$1.2 物資本東沿灣衛行·西洋衛聯之衛先應問除·存納重點國之項員與司 (本表記 1917年) 以與下企整、在工人数其規則應即實購刊,以利益提工事項打分析 工具、(2)2 (2) (2)

直高端建木剑者结等直肠解析,你完硕各处直新的可能的原验办例的 (5),例:【1】 皇帝を教がられ 杜皇宫是一种结核用之同隔的水成一海价增强的用行均或种型一从有 高信道是文字,进至以京迎上整观的高性的水道和特定社上作道章。 城本部间的技术,需要把實功有較減。(4.02.06.1**[1]** 

日蓮標心禁止無關人高麗人。(克.)4.(株.02)【1.]

大數碼款、應定的項所與工程的作。逐工機構造得時,均應宣帶相關 (注:14.68)[1] 要拍索原不定念·影響環境、(克·朗·特)【[] 和排除基礎生產物。(Adl:34) (LT Q個之法班上海水原線。(1.01.06) [1.] 病因为本干燥。(5. 株. 株. 校) [1]

走出非常处理人们。(人(6) (6) (8) (3) [[1]

他開放解洗水、並以影响不保養及其抗遺液、增加計和直接開始能 我们一条按: 保宣社装施保护: 我们行李工准, 植物之脉须管理原则

在、物字等、同种民程確定推進之機構 6. 是知信用语管理、尼艾尔或证据以抽屉里理用语言企 法建模设置物的汽车建设

按钮远视时表: 核核, 推进马强多维性长病精态坚防, 或作剂需增水制物下, 约 就需大學抽來,目於白糖報、改品儲蓄動物場行、或使單時過度、相對技术技能

拉伸自治上他沿及阿伊拉上直输及抗工物表、哲学者此称-学等服务生式、现在

积余组织表、抗击其糖式各律执病方法,而非准规及约法程法,

九海水水柱沿水、排材市品成功、其保積水表下及、消水池及後積於槽板情温報 **计循环双分替甲式弹劾一阵机精裁混乱正约的矩道** 

有(每台市运车条公司): 以為

成成前1点指三线放射桶件直接公司11月級一

由来為均量及可轉資於法權應應者,請訊報的和於本三程必要實際之及分之一。







### 履約管理(2/2)



- 編列工程材料檢驗費,降低費用支出,提昇品質效率。
- 將混凝土穿透鑽心及抗壓強度試驗等材料檢驗納入,落實三級品管制度。
- 抽驗鋼筋1次、混凝土3次全數合格







#### 鋼筋抗拉伸試驗



28天材龄試體抗壓



### 維護管理





#### 生態檢核

■ 依據集水區友善環境生態資料庫查詢成果表,當地物種為大冠鷲及三線蝶、遷粉蝶等相關蝶類,本工程以柔性生態工法設計,並種植誘鳥及誘蝶植物且保留現場大樹。





生態檢核表



- 淨零排放 創新挑戰
- 防災與安全 經營效益
- 環境保育



#### 淨零排放

#### 植生固碳量

土壤碳固存

- ✓綠化面積5500m<sup>2</sup>
- ✓固碳量137.5ton CO<sub>2</sub>
- ✓護坡面積5500m²
- ✓固碳量35.73ton CO<sub>2</sub>

減碳量 86.8%

減量前469.08t

#### 混凝土減量

- ✓減用混凝土1580m³
- ✓減少399.74ton CO<sub>2</sub>

#### 鋼筋減量

- ✓減用鋼筋3.5ton
- ✓減少4.6ton CO<sub>2</sub>

#### 卡車排放量

- ✓減少52運棄車次
- ✓減少2.88ton CO₂

減碳量 407.22t


減量後61.86t

- 工程會-公共工程計畫相關審議基準及綠色減碳指標計算規則
- 環保署-碳足跡排放係數資料庫



#### 防災與安全(1/2)



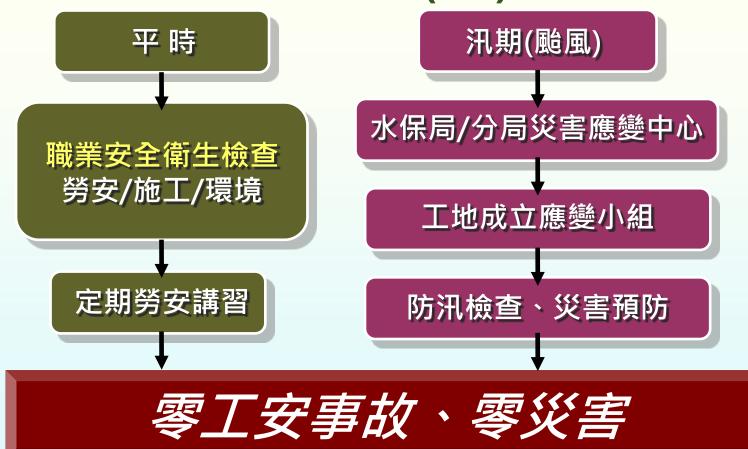

優質·效率·图隊 37



# 防災與安全(2/2)









勞安講習

材料堆置保護

防汛整備







高差大於2m設置護欄

工區大門管制

告示牌設置



# 環境保育(1/2)













# 創新挑戰(1/2)







# 創新挑戰(2/2)

#### ■ 柔性生態工法

















#### 經營效益(1/5)

- 營造綠化自然草坡,利於土壤保護及<mark>水源涵養</mark>,減少地表逕流量。
- 改善後有效蓄水量約1920m³、滯洪量約890m³,供周圍農地灌溉使用面積約4ha。









## 經營效益(2/5)

S W C B

■ 生態營造效益-蝴蝶谷、帶動周圍景觀遊憩。

















## 經營效益(3/5)

6

■ 串聯周圍景點、增加賞景遊憩秘徑。









#### 經營效益(4/5)

結合地方產業發展,品味在地生態、文化深度體驗。





DAY1: 給參村豐存好茶茶鄉體驗→螢蝶舞東光星月菇饗宴(東光蝴

蝶廊道)→鹿篙咖啡、紅茶、蝴蝶谷生態農塘

DAY1:樹葡萄體驗DIY遊程→新故鄉見學園區遊桃米(紙教堂) →

目月潭。桃米賞螢季→住宿桃米

DAY2: 給參村豐存好茶茶鄉體驗→日月潭貓頭鷹之家紅茶、木頭

DIY →鹿篙咖啡、紅茶、蝴蝶浴生態農塘

DAY1:客家村生憩巡禮→桃米休閒農業區→日月潭、桃米賞螢季

→住宿桃米

DAY2: 給參村豐存好茶茶鄉體驗→貓頭鷹公園→鹿篙咖啡、紅

際、蝴蝶浴生態 農塘→入住魚池鄉

DAY3: 螢蝶舞東光星月菇饗宴(東光蝴蝶廊道)→翠林農場



## 經營效益(5/5)



#### 媒體報導

#### 鹿篙香茶巷一日遊~鹿篙咖啡莊園/貓頭鷹之家/鹿篙農塘秘境





























# 評審項目對照表

評分指標	評審項目	參考頁面
品質管理	1.主(代)辦機關之品質督導(保證)機制	p.24
(制度/施工)	2.專案管理廠商之品質督導(保證)機制	無專案管理廠商
	3.監造單位之品質保證機制	p.22 \ p.24~27
	4.承攬廠商之品質管制機制	p.23~24 \ p.28~29
進度管理	1.施工進度管控合理性	p.30
	2.施工進度落後因應對策之有效性	p.30
品質耐久性與維護管理	1.規劃設計	p.14~21
	2.履約管理	p.31~32
	3.維護管理	p.33
節能減碳	1.周延性	p.36
	2.有效性	p.36
防災與安全	1.工地安全衛生	p.38
	2.工地災害預防	p.37
環境保育	1.環境維護	p.39~40
	2.生態保育	p.35 \ p.39~40
創新科技	1.創新挑戰性	p.41~42
	2.科技運用	p.15

優質・效率・團隊



















# 報告完畢敬請指教
