

壹、工程緣起

貳、工程內容

參、規劃設計

肆、工程特色及效益

伍、工程品質三級管理特色

陸、結語

柒、其他要項



簡軟人



地理區位



區位

- 嘉義縣阿里山鄉
- 阿里山國家森林遊樂區

●南二高-台18線 遊憩

●中山高-台18線 人数

100萬人!!





農業部林業及自然保育署

嘉義分署
Chiayl Branch, Forestry and Nature
Conservation Agency, Ministry of Agriculture



面鹽課題(2/4)



面臨課題 (3/4)











面临課題(4/4)





工程基本資訊



1.拆除混凝土 6m3

2.移除步道石板 347m2

3.利用既有石板重新整修鋪設 208m2

4.地版貼亂石片 66m2

主要工項 5.鋪新購自然面砂岩石板 238m2

6.砌空心磚 5m2

7.臨時便道 113m

8.姊潭涼亭地板更新

9.屋面板更換及原茅草拆除重蓋

姊妹潭附近步道整修工程預定進度表 I.程進度 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-170 假設工程 排水工程 既有石板重鋪工程 50% 新購自然面砂岩石板 33% 姊潭涼亭地板更換工程 17% 姊潭涼亭屋面板腐朽 預定進度 累積預定進度 19% 35% 100%

契約工期:170日曆天

履約期限 開工日期:112年04月19日

完工日期:112年11月27日

契約金額 新台幣4,640仟元

09

是加加图







规劃目標(1/3)



農業部林業及自然保育署 嘉義分署

Chiayi Branch, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture







规劃目標(3/3)





設計構想 (1/3)





2

施工分段規劃









設計構想(2/3)







設計構想(3/3)











工程設計(1/7)



● 調查現有步道,重新分段規劃

> 依建築技術規則設計戶外階梯

- 戶 外 階 梯 階 高 階 深 規 定 (2R+T≥64(CM)且R≤18(CM))
- R:每階之階高。
- T:每階之階深。
- (設定階高為12~16 CM;階深為 35~63 CM)
- 斜坡坡度(需小於15分之1)
- 步道寬度(需為1.5公尺)

> 陰溝縫設計,增加石板導水

- 新設自然面石板縫隙1.5±1.0cm
- · 轉角處或手工裁剪處≤3cm。
- 既有自然面石板縫隙2.0±1.0cm
- · 轉角處或手工裁剪處≤5cm。





工程設計(2/7)





工程設計(3/7)





工程設計(4/7)



工程設計(5/7)







工程設計(6/7)





工程設計(7/7)







符合規範戶外階梯





新售石材分類配置





質物可利用



農業部林業及自然保育署 嘉義分署 Chiayl Branch, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture







落實生態檢核





慎選臨時步道路線



材料運輸施工困難



農業部林業及自然保育署 ^{袁義公異}

iayi Branch, Forestry and Nature nservation Agency, Ministry of Agriculture



膜地狭小施工範圍受限(1/2)



農業部林業及自然保育 嘉義分署



膜地狭小施工範圍受限(2/2)



農業部林業及自然保育署 嘉義分署

Chiayi Branch, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture



党服不良天侯因素







專業審查及參與



施工期間聘請專家學者督導,經過署督導及分署督導

皆達甲等成績。

主辦及監造隨時進行走動式督導。

林業及自然保育署督導



83.5	场标准附近少篇整张工程		各長期門里山州	
18	门从就是常会员全场你在各条的签令效应			
¥m	此所在聯合土 永統物學維持 数值單位 故物學維州	不也有	A.合木水也工業	
(株)	4,813	(十元)	4,440	
	一、二般概要: 由門里山間任務地理石能步道,故久: 與石能支持,與部份以善或支配成為全役; 高、使形理事項付。提昇確整品質。			
	I ROUNE	162		
	2. mpeans	2476		
	1 MARKERSHERS	206e*		
	1 #840000000	2384		
	5. 6888.67	120		
		141		
	7. 6494	t IISe		
	1. 梅里油子的瓶瓷料 1	16		
KM, ®	1. 医布拉克排孔原护军标论重复	11%		
	I-CERIBAT!			
	Leggina	70w		
	2. 利用现有石板重新整体模块 1	F 56/		
	1. 解除精育的杂砂含石板 1	204		
	4. mg-uit 1	1.16		
	S. merca	113e		
	19、将来完成工程所容:			
		t fo'		
		277e		
		205e*		
		238a'		
	i excent	- (4a'		

工程施工督導小經營等紀錄

でまる第 132年度経過資益先生終基金 計畫 (では収集室各員金料集 株式 (では収集室各員金料集員 (では収集室各員金料集員) (12,07,11)

	6. 研集公司	17 66			
	7. 特涅治学地教史斯	H IA			
	区 星面板更换及物产单约检查器	11 14			
	表表112年87月10日A:				
8.0	工程系计块度: 独区 12.23%; 常用:12.53%				
12.	LMBEHARING MC MICHAITE	3.40 1			
	原在其外等,现在并充物	提工及施定	132年04月1日日 132年08月27日 (金田太平日工報22日		
	保護: 计段传送长度40	V-9-0-80	310(YX)		
i.	工作人員:影技士美名 (報度	(88)	WIN(AR)		
株は 本の は は は は は は は に り は り に り に り に り に り に)建進工項,軍上裝完成無非項。)使進軍人投資機內盜物資制良好。 -因他投3加乙機地工團第一百分內運完! 使進軍人網絡人位分買良好。	1.按照约规定通	**		
	1制度 1機關藥產監查公童表料意完長时容、表		es an est free		
2.0	·使服务实验及中国水利亚元式汽车。 ·使服务实验及工程品管管理作業要购买	+ - PORT	4 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
	H. H. I L.				
	·线链投资计量还审核营养宣使再核汇 目				
	4機關總官管理总統本購其規劃設計監過				
	9機器標案管理系統表購其交付費、交付 (管理者核定用數字數、(表別, 13) 【[集]		1次交易X5人: A.B.		
	计算机工品会提供管理机能选择其抽象		00 at 05 per fil t		
	ROAF CHROMOST LASS				
53	可重於科拉斯管制衛長終其而飲物所用	H14 - (4.82.0	H. H. HO. (U.)		
	單位協有表單論有機構型的表構具。()				
	*根壳头膜具上积管等此特殊果:能迫物				
	·健與檢查表與編碼、結果:監查報表表 監查報表表情不不符合事項報告結構。				
	EGRACHICATOR CONTRACTOR CONTRACTO	MA . M. K. C.	exemp.		
	等位的我工/品管计查要型表现品值用:		# A - CE (0 4) (6)		
TI.	1				
	表行完法月本 10日內府等班也按查標準				
	1. 單位材料记鉴学到徇丧之本情记客撰约	国有审科表示	84		
	92.03, 84.92) [1.3				
	- 班州村科及北工经验大批约和監查抽動	相同 · 编年度	A - (0.00.02.02.03.00)		
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A COUNTY OF STREET		
	- 麻煎材料这等管到徵表一本材值剂無爽				





林業及自然保育署嘉義分署督導





_				
	A fine	n manne-se	\$80K (88)	84.9(**)
	EBAA: 897	"技士 農伙長所二個會規定網署	- 46 7 10 00	
	CONT.	SURFICIAL SECTION	67,83	TORVERY NO
		电线管电路下其外形能 度	(47.担意名)	LEWIS .
		电比索机路·福雷赛集 。		
		设备是由工具查查率。	地工物報序目	数等 - 符合本案二组特
24		ANNUAR (M) WE		
	425·	MILES OF STREET, STREE	9170 m. m.	TARREST CONTRACT
R.H	工程・サ・後期	·····································	MERSE	SEMMARREUM:
	- 有政政学院工			
		阿納夫一均要名称工程并		4.80.8.625
		是商型企物工界的的問題 項工程品質管理應準行为		100
		- 村村花園株 (31.) 衛星		
	GREAT AND A	LAME - ROBERS	* N 二 图 H	400
				6次、连一連行檢驗具限
		电各种科约符合表案定点		
		乾取樣得關、符合監通》 水平壓出狀、線型過萬一		医费塞比特别表示:
		化丁烷及比 班公司之		
	Bank.	CALCULATION AND STREET	UNIVERSAL PROPERTY.	
		AF-ALGRES		写住 - 建镇德行线存在
LIR	统一直的指击设备	南流行幣別理如止深。		苏俊 - 建镍液分析 6.6
地北北	使,显斜野走沿着 缝柱搭枝,近二台 月線人行表出度的	南進行黎利禮加止潛。 ,他在信辱等,通索照片 ,連減、建議遺傳線並不	Let.	
() () () () () () () () () ()	使,並糾打充損者 餘相輕技、近二百 月線人行走出度 遊園擴入及走前	·尚德行黎副禮如正潔。 ·他後信藥等,避免照出 ·禮域、建議遭得極無罪 (在)	2.模- 人·德州在四	· #2##4# - 114
经存成的	後,並納野充沒者 餘程超效,近二位 月線人行表出及可 遊舊擴入及及安 收尾建級為與官司	南進行黎利禮加止潛。 ,他在信辱等,通索照片 ,連減、建議遺傳線並不	2.模- 人·德州在四	· #2##4# - 114
经存取的存储法	後,並對對北京市 檢稿提改,近三位 即購入行走出來 遊園擴入及光宗衛 收見遭被 為國證 或述 或述 或述 或述 或述 或述 或述 或述 或述 或述	病生行整剂增加止源。 使免化等等,或有照从 使说、建筑遗传程多尔 (度) (度及聯合、建筑政务等	記憶 - 人、懷迪處理 展示組之股所	· 建克律權報題 · 這成 捷石及建筑上資 · 造行
依非明府通禮潭存	度、並終的充沒 種相相故、成二位 用線入行及出來 或繼續 或是連續 或是連續 可由 ((1) 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	由他行整划增加止源。 地域们等等。成有照片 透減、建築環路程至下 (度) L環境融合、建筑成集份 (開始本個環、其中最小 的体質形之與環境及場場	登録・ 人・信用を理 通言形に指所 の回編・事項 日本が信息位	· 建克律權報題 · 這成 捷石及建筑上資 · 造行
经处理的公司 经存储的 化二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲	度,並新指生活在 使相构技术或工作 用線人行表達用 或是連接人及是否 或定理 中心:(1)规定的 中心的:(2)中心 、健康進行程差。	(由生行整剂增加止溶。 (性性化等等、进电损从 (性性、建设度体性生产 (皮) (皮) (皮) (皮) (皮) (皮) (皮) (皮) (皮) (皮)	登録・ 人・建造を理 通言形に数例 の回線・事項 をよが位置位 数・	· 禮克府項註經 · 沒也 建工及規則上運 · 連行 也禮書所例 · 禮道所約 · 禮鏡與工作均可輸過並

工程督	等小组督等簽	到表	
- 程標業名稱:婦妹	草附近多道整榜工	粗	
· 準日期:112年11月	811		
5點:阿里山國家森村	水理鄉區		
14:李灵老			
·传会员:			
×31200	基型是	3季级	
报主辦單位:	2		1
7.被称 /	专系服	金鸡。	激激
柳草位:			
ARE /	海佐 ###	r.	
計監造単位:沈明付	2個企上木挂師事	Brit.	
Horst	三 凍粉囊	7年2月	5
. 丝疮商: 九合土木台	上工業		
E工程人员	59.	人員 廖校高	
	10 工化		



零工资郵解與如即如質崇工

阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道全線通行啦!農業部林業及自然保育署嘉義

分署為提升山友行走安全與舒適,今年年4月19日採分區封閉做步道改善,昨天公布經

費8個月改善工程,步道即日起開放全線通行。


林務局嘉義林區管理處今天發布新聞橋指出,阿里山森林遊樂區姊妹潭為園區知名景

點,由沼平往姊妹潭方向石板步道,為遊客造訪森林遊樂區主要旅遊動線之一,因部

分石板破裂、鬆動,為提升步道品質,將自4月19日至11月15日部分封閉進行改善工



農業部林業及自然保育署 嘉義分署





保留歷史足跡。節省公帑





施工期間園區下常營運



農業部林業及自然保育署 喜義分署

ayi Branch, Forestry and Nature nservation Agency, Ministry of Agriculture



環境便原路特無痕皿体理念



農業部林業及自然保**育署** 嘉義分署

嘉義分署 Chiayi Branch, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture



石板步道就作



農業部林業及自然保育署 嘉義分署

Conservation Agency, Ministry of Agriculture





農業部林業及自然保育署 _{克恙}公翠

ayi Branch, Forestry and Nature nservation Agency, Ministry of Agriculture



工程優奧事價



農業部林業及自然保<mark>育署</mark> 嘉義分署

Chiayi Branch, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture



節能減碳



- → 砌石節能減碳
- 新設砌石取代混凝土,節省混凝土約16.66m3,減少 1m3混凝土減碳440kg,減碳達7,330.4 kg
- 舊有石板重新利用,減少新購石板面積為208m2,並減少新購石板生產運輸碳排放量達416,832kg
- 舊有石板運棄排碳量,依傾卸貨車15T進行初估, 3天*8小時*13.6耗能*2.65柴油碳排放係數為866.9kg

混凝土減量

- ✓ 新設砌石取代混凝土
- ✓ 減用混凝土約16.66M³
- ✓ 減少7,330公斤CO₂

減少新購石板量

✓ 減少新購石板面積208m2 ✓ 減少416,832公斤CO。

舊有石板無運棄

- √依傾卸貨車15T進行估算
- ✓ 減少866公斤CO₂

減碳量

=7,330+416,832+866

= 425公噸CO₂





一、品質取樣及施工查驗

二、材料取樣試驗統計

三、施工查驗統計表

四、落實生態自主檢查


五、技師及承辦督導

六、職安品質要求

嚴守三級品管制度



- ■依「施工品質保證系統」及「施工品質管制系統」
- ■確實執行,確保工程施工品質

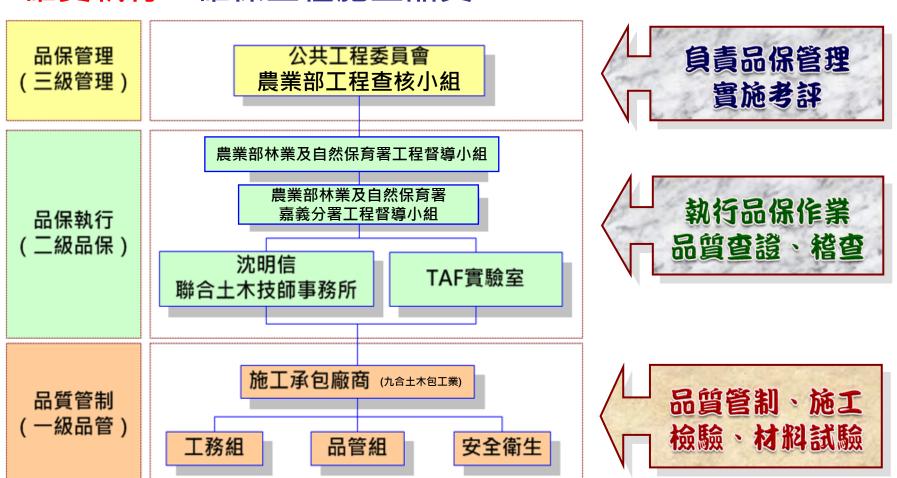

部畫書核定



皆於112/04/19開工前核定與審查通過

正本

檔 號: 保存年限:

行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處

600073

地址:嘉義市森林西路1號

承辦人:游智宇

受文者:沈明信聯合土木技師事務所

發文日期:中華民國112年3月1日 發文字號:嘉育字第1125100618號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

嘉義市玉山路158巷91號

附件:如説明四

主旨:有關貴事務所提送「姊妹潭附近步道整修工程」監造計畫 ,復如說明,請查照。

說明:

- 一、復沈明信聯合土木技師事務所112年2月22日(112)信土字 第216號函。
- 二、旨案工程之監造計畫,本處原則核定,惟後續如有發現與 契約規範、圖說及規定相抵觸之處,仍應依契約規定辦理。
- 三、請貴事務所依旨揭監造計畫及行政院頒布之「公共工程施工品質管理作業要點」等相關規定履行監造職務,核實監督施工方式,並確實落實三級品管、計畫書審查、品質管制、抽查驗程序等相關作業,以確保工程品質。
- 四、檢還上開監造計畫書紙本1份,請貴事務所留存備查,另2 份由本處留存。

正本:沈明信聯合土木技師事務所

副本:本處育樂課

處長张 岱

第1頁 共1頁

正本

600073

檔 號

保存年限:



1000

地址:嘉義市森林西路|號

承辦人:游智宇

嘉義市玉山路158巷91號

受文者:沈明信聯合土木技師事務所

發文日期:中華民國112年4月6日 發文字號:嘉育字第1125101048號 速別:普通件 密第及解密條件或保密期限:

附件:如說明三

主旨:有關貴事務所提送「姊妹潭附近步道整修工程」施工計畫 書、品質計畫書一案,詳如說明,請查照。

行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處

說明:

- 一、復沈明信聯合土木技師事務所112年3月30日(112)信土字 第374號函。
- 二、旨案工程之施工計畫、品質計畫書,既經貴事務所審查 合格,本處原則備查,惟後續如有發現與契約規範、圖 說及規定相牴觸之處,仍應依契約規定辦理。
- 三、檢還上開施工計畫書及品質計畫書各一式1份,敬請貴所 及施工廠商妥為留存供後續查察,並請監造人員依核定 內容督促施工廠商。

正本:沈明信聯合土木技師事務所

副本:九合土木包工業、本處育樂課(均含附件)

處長機 岱

第1頁 共2頁

品質取樣及施工查驗

◆ 著重隱蔽部分查驗工作



步道新購石板進場尺寸查驗



步道新購石板石板試鋪查驗



平面步道石板斜坡坡度查驗



平面步道石板鋪設寬度查驗



階梯步道石板鋪設級高查驗



姊潭涼亭整修木作查驗

材料取樣試驗統計



契約規定檢驗項目	單位	應檢驗次數	已檢驗次數	符合次數	未符合次數
混凝土圓柱試體抗壓試驗	組	1	1	1	0
鋼筋抗拉、抗彎試驗	支	1	1	1	0
木材材質測試	塊	2	2	2	0
木材ACQ防腐測試	塊	2	2	2	0
合計		6	6	6	0

木材取樣三方送驗



圓柱試體抗壓



木材現場取樣



鋼筋抗拉、抗彎



施工查驗統計表

木作工程

護木漆工程

生態保育措施

臨時防減災措施

安全衛生及環境保護

合計



臨時便道1處欄杆柱未牢固

已改善完成。

◆抽查10項工程,共計48次

抽查項目	應抽查次數	已抽查次數	符合次數		合格率95.8% 缺失改善完成
開挖工程	3	3	3	0	
鋼筋工程	4	4	4	0	
模板工程	4	4	4	0	,
混凝土工程	4	4	4	0	
石板工程	6	6	5	1	既有石板重新整修鋪設線 隙不合格,已改善完成。

自主檢查統計

合格率99.3% 不合格全數改善



横筋工程 4 4 4 0 0 点疑土工程 4 4 4 0 0 元板工程 8 8 8 7 1 元板縫隙調整 木作工程 2 2 2 0 0 意	契約規定抽查項目	應檢驗次數	已檢驗次數	符合次數	未符合次數	備註
模板工程 4 4 4 4 0 品凝土工程 4 4 4 0 石板工程 8 8 7 1 石板縫隙調整 木作工程 2 2 2 0 護木漆工程 2 2 2 0 職業安全衛生自主檢查 57 57 57 0 環境保護自主檢查 57 57 57 0 合計 147 147 146 1	開挖工程	3	3	3	0	
程凝土工程 4 4 4 0 0 石板工程 8 8 7 1 石板維除調整 1 1 石板維除調整 1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	鋼筋工程	4	4	4	0	
石板工程 8 8 7 1 石板縫除調整 木作工程 2 2 2 0 護木漆工程 2 2 2 0 職業安全衛生自主檢查 57 57 57 0 田期工地防災減災自主檢查 6 6 6 0 環境保護自主檢查 57 57 57 0 合計 147 147 146 1	模板工程	4	4	4	0	
木作工程 2 2 2 0 護木漆工程 2 2 2 0 職業安全衛生自主檢查 57 57 57 0 刑期工地防災減災自主檢查 6 6 6 0 環境保護自主檢查 57 57 57 0 合計 147 147 146 1	混凝土工程	4	4	4	0	
護木漆工程 2 2 2 0 職業安全衛生自主檢查 57 57 57 0 刑期工地防災減災自主檢查 6 6 6 0 環境保護自主檢查 57 57 57 0 合計 147 147 146 1	石板工程	8	8	7	1	石板縫隙調整
職業安全衛生自主檢查 57 57 57 0 和期工地防災減災自主檢查 6 6 6 0 環境保護自主檢查 57 57 57 0 合計 147 147 146 1	木作工程	2	2	2	0	
田期工地防災減災自主檢查 6 6 6 0 0 で 環境保護自主檢查 57 57 57 0 0 147 146 1	護木漆工程	2	2	2	0	
查 6 6 6 0 環境保護自主檢查 57 57 57 0 合計 147 147 146 1	職業安全衛生自主檢查	57	57	57	0	
合計 147 147 146 1	汛期工地防災減災自主檢 查	6	6	6	0	
	環境保護自主檢查	57	57	57	0	
	合計	147	147	146	1	F 0



農業部林業及自然保育署 嘉義分署

Chiayi Branch, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture

生態友善機制施工階段照片及說明

1. 機具、材料和廢棄物堆放,請堆置於裸露地或空曠處,勿堆放於森林 裡、大樹周圍與樹根裸露處。

[施工前]



置於裸露地或空礦處 2. 臨時遊客通道, 內

[施工前]



日期: 112.05.04 說明:臨時遊客通道 置防護,限制遊客行進 3. 鄰近大樹施工時 [施工前]



日期:112.4.23 說明:鄰近大樹施工時 護,小心不要傷害到樹

1. 機具、材料和廢棄物堆放,請堆置於裸露地或空曠處,勿堆放於森林 裡、大樹周圍與樹根裸露處。

日期:112.9.26

[施工前]

置於裸露地或空曠處

日期:112.05.04

日期:112.4.23

[施工前]

說明: 臨時遊客通道:

[施工階段]

機具、材料和廢棄物堆放,請堆置於裸露地或空曠處,勿堆放於森林

說明:機具、材料和廢棄 2. 臨時遊客通道, 西 日期:112.10.19

说明:機具、材料和廢: 置於裸露地或空曠處 臨時遊客通道,

置防護,限制遊客行進料

3. 鄰近大樹施工時 日期: 112.05.04 說明: 臨時遊客通道 置防護,限制遊客行進 鄰近大樹施工時 [施工前]



日期:112.4.23 說明:鄰近大樹施工時 護,小心不要傷害到樹,

[施工階段] 1. 機具、材料和廢棄物堆放,請堆置於裸露地或空曠處,勿堆放於森林



日期:112.10.19 說明:機具、材料和廢棄物堆放,堆置

於裸露地或空曠處 2. 臨時遊客通道, 兩旁請確切設置防護, 限制遊客行進路線。

說明:機具、材料和廢棄物堆放,堆



日期: 112.05.04 說明: 臨時遊客通道, 兩旁請確切設 置防護,限制遊客行進路線。

日期:112.11.26 說明:已設置防護,限制遊客行進

3. 鄰近大樹施工時,請包覆樹皮保護 , 小心不要傷害到樹皮。

日期:112.10.19



日期:112.4.23 說明:鄰近大樹施工時,包覆樹皮保

護,小心不要傷害到樹皮。

[施工階段]

日期:112.4.23 說明:鄰近大樹施工時,包覆樹皮保 護,小心不要傷害到樹皮。

C01 生態友善機制自主檢查表

表號: 08 检查日期: 112/11/26

施工進度: 99.88 % 預定完工日期: 112/11/27

項	項	2 2		執行	結果		
目	次	檢查項目*	已執行	執行但 不足	未執行	非執行 期間	執行狀況陳述
生態保	1	機具、材料和廢棄物堆放,請堆置於 裸露地或空曠處,勿堆放於森林裡、 大樹周圍與樹根裸露處。	•				機具、材料和廢棄物 堆放,堆置於裸露地 或空曠處
全對象	2	臨時遊客通道,兩旁請確切設置防 護,限制遊客行進路線。	•				已設置防護,限制遊客行進路線
	3	鄰近大樹施工時,請包覆樹皮保護, 小心不要傷害到樹皮。	•				已包覆樹皮保護
生態友	4	垃圾與廚餘請確實分類和打包,勿讓 動物誤食。	•				已確實分類和打包
善措施	5	施工時段請避開動物覓食及活動旺盛 期間(早上8:00前及下午5:00 後)。	•				已避開早上 8:00 前 及下午 5:00 後 工

備註:表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商





環境背景資料蒐集



















生態關淮區域及措施協商成果


工程點位



		The state of the s
圖層名稱		是否涉及
保安林		×
水庫集水區		0
	自然保留區	X
	野生動物保護區	X
法定生	野生動物重要棲息環境	X
態保護區	自然保護區	X
	國家(自然)公園	X
	一級海岸保護區	X
+ 小手西	國家重要濕地	X
	水庫蓄水範圍	X
工公外心區	安林 車集水區 自然保留區 野生動物保護區 定生 保護區 国家(自然)公園 一級海岸保護區 國家重要濕地	X
		N N
		1

生態情報圖、生態關注區域、生態友善措施平面圖

1.機具、材料和廢棄物堆放,請堆置於裸露地或空曠處,勿堆放於森林裡、大樹周圍與樹根裸露處。

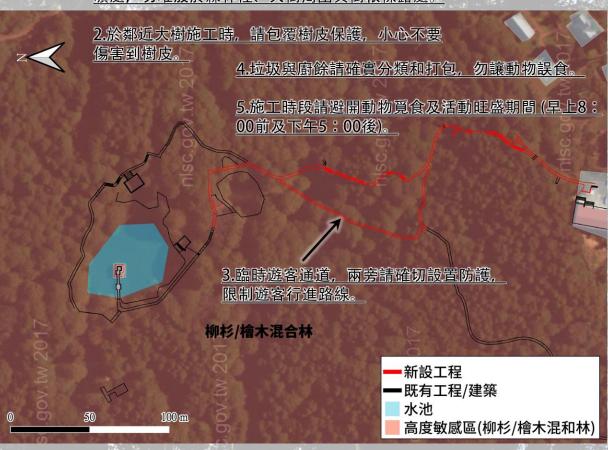

農業部及自然保育署嘉義分署督導及執行抽驗

總計督導 11次

編號	日期	督導內容
1	111.09.12	111下半年度暨112年度森林育樂及步道 計畫預定工程生態友善機制分級審查會議
2	112.03.14	施工前說明會議
3	112.04.17	臨時便道設置前生態檢核會勘
4	112.04.27	竹節鋼筋、材種鑑定及ACQ試驗
5	112.05.08	施工督導紀錄
6	112.06.15	索道路線勘查紀錄
7	112.06.30	施工中生態檢核督導紀錄
8	112.07.04	姊妹潭附近步道整修工程既有石板細部施 工討論
9	112.09.20	工程督導紀錄
10	112.10.11	工程督導(小犬颱風防汛整備現勘)
11	112.10.19	分區施工開放會勘紀錄








第1頁共1頁



監造技師督導及執行抽驗

血足		
編號	日期	督導內容
Q-01-01	112.04.24	乙種圍籬尺寸抽驗
Q-01-02	112.05.12	改道指示牌設置位置抽驗
Q-01-03	112.05.26	自然面砂岩石板進場尺寸抽驗
Q-01-04	112.06.02	臨時便道抽驗
Q-01-05	112.06.20	鍍鋅格柵鈑進場尺寸抽驗
Q-01-06	112.07.04	既有石板細部施工會勘
Q-01-07	112.08.25	A03~A04段石板步道尺寸抽驗
Q-01-08	112.09.27	A排水溝蓋板尺寸抽驗
Q-01-09	112.10.13	A01~A02段石板步道尺寸抽驗

總計督導 9 次

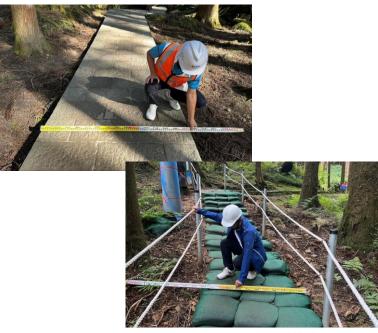

沙丽信雕会上水技師專務所

I.	权	2	44	姊妹潭附近	步道整修	LN							
I.	報	地	XL	品成縣 門 5	E T 84								
汞	8	瘊	商	允合王本包	工業	I	EL.	金	额	4, 64	0,000	元	整
HI.	T.	В	88	112年84月1	9.8	tr.	專	В	88	112.	6.2	2	
項	次	督	-	埠	項		В	샴	導	杜	果	備	13
	1	承包的	福黄	填寫各工項	自主檢查	Ą.		Mos	□ 不	合格			
	2	承包书	核树	填寫施工目	tt		1	√ 6 *	¥□×	合格			
	3	勞安!	北京	夢安依規定	執行情形			Vas	5 □不	소 格			
	4	環境相	电放射	持工作	终工作				☑合格□不合格				
	5	依合的	执行	工程各項工	作進度			☑合格□不合格					
	6	完成	.構造	物外觀及尺	寸檢查			M&	3日本	合格			
	7	品管工	42.0	及營造職品	質管制情	#5		MA+	本口本	승格			
	8	接続者	F伶 A	寸材料抽查					不口	合格			
	9	公共生	全全县	污染物治物	行情况			VO	小下	合格			
	10	工程制	失力	正情形				West	不回	合格			
建计	(事項:												

原國國唱社社区。 王班会社院好专演完成的现代是了整理 設計事意 |20±15cm、表演|(拍演|)/10-115cm、 欄杆高度9±5cm、单读|(拍演|)/在9/cm、 **首城土包辖国、各公国武村走。**

整工	772 C**	營造廠工地負責人	章末炭 (#
45.10 /		416	3 + 14 fm

沈明信聯合土木技師事務所

£E.	.S. 16	姊妹潭附近步	道整修工程							
SE.	地 加	差義務 阿里山	義務 門里山鄉							
8	泉 市	九合王本包工	£ 1	8.	全	额	4, 64	0, 000	光生	ķ.
I.	в ж	112年04月19日	9	- 8	H.	101	1/2.9	. >1		_
水	11-	华	項	18	督	8	18		備	7.5
1	承包密磁1	『 堪寫各工項自	主检查表		N/O-R	(TX	合档			_
2		多線寫施工目誌			DION					_
3	劳安日达8	· 劳安依规定執	行情形		VIGE	日本	会格			
4	環境檢查的	排工作			MON					_
5	依合的執行	工程各項工作	進度		MOH	一不	合格			
6	完成之楊月	物外觀及尺寸	检查		☑合格□不合格					
7	品管工程的	4及替達廠品質	管制情形		□合格□不合格					
8	能最早份人	七十材料抽查			□合格□不合格					
9	公共安全总	上污染防治教行	传说		☑会格□不会格					
10	工程納失司	2.正情形			☑会格□不会格					
9 10 紙事項:	公共安全A工程缺失的	上污染防治執行		出港1.	Man Man	一不	合格 会格	t d'i	र्ग -	

「大元丁(茶章) 登造廠工地負責人 哲學人 Straff=

職安品質要求















農業部林業及自然保育署 恵義分異

Chiayi Branch, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture

































部基準説明



第八點附表五修正規定↔

附表 公共工程品質優良獎評審基準₩

評分指標□	評審項目↩	拌客基準	權重
	 工程執行(代辦) 機關之品質督導 (查證)機制() 	 對專案管理、監造單位及承攬廠商之履約管理能力・ 監過計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤落實度・ 	
	 專案管理廠商之品質督等(查證) 機制⑷ 	 對工程全生命週期善盡義務,發揮管理專業,主 動協助機關執行專業管理工作之執行情形。母 對監造單位及承攬廠商之履約管理能力,及對監 造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤及履約能力等 事項。母 	
品質管理↔ (制度/施工)↔	 3. 監造單位之品質 查證機制← 	 監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查、材料設備抽驗及施工抽查、品質稽核及文件紀錄管理系統等監造計畫執行情形。 缺失改善追蹤等之執行情形。 	10%
	 承攬廠商之品質 管制機制及成效 	and the second of the second o	
	 施工進度管控合 理性← 	 預定施工進度是否合理・≠ 實際施工進度管理是否有效・≠ 	
進度管理←	 施工進度落後因 應對策之有效性→ 	 進度落後是否提採適當改善措施・≠ 改善措施實際運作是否有效・₽ 	10%
品質耐久性與維 護管理4	1. 規劃設計↔	 規劃設計對營運使用需求考量之周延性・ 細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整性・ 公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動不便等)差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性・ 	25%

	2. 履約管理↓	 工程施工管理之嚴謹度・4 工程材料檢驗之完整性・4 工程管理電子化作業運用度・4 	
	3. 維護管理中	 維護管理手冊之妥適性及周延性(專案評估公共 工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處理 方案及其時機)・ 提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程,以 利採購機關後續接管運用・ 環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行・ 工程設計、施工及維護各階段對節能滅機関延之 	
節能滅碳↩	1. 周延性←	充分考量·↓ 2. 循環經濟,資源有效再利用之具體考量·↓	15%
BY BE WOOM	2. 有效性←	 工程設計、施工及維護各階段運作對節能<u>滋暖之</u> 有效作為・↓ 能源光電相關<u>節能減暖產品</u>之使用效益・↓ 	10/1
防災與安全↩	1. 工地安全衛生↓	工地環境衛生整潔、安全措施(安全圍籬、安全護 欄、安全警示標誌、交通管制等項目)之落實度·《	10%
	2. 工地災害預防₽	意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性・↓	
環境保育↓	 環境維護→ 生態保育→ 	樂音、光線、溫度、空氣維護管理之周延性・↓ 1. 規劃設計階段考慮降低對生態系統之衝擊・↓ 2. 施工階段考慮對生態系統之干擾,並確保生態保全對象、生態關注區域完好及維護環境品質。↓ 3. 維護階段衡量維護時機、強度、方法、材料、範圍對動植物之影響及檢視生態環境恢復情況。↓ 4. 各階段應詳實填報生態調查、生態保育措施及保全對象・↓	20%
	3. 公民參與 <mark>與</mark> 資訊公 開落實情形←	各階段予關心生態議題之在地民眾與公民團體有共 同參與,建立互動平臺,忠實公關所有資訊·↔	
	1. 創新挑戰性↩	工程於施工及材料運用新工法及新材料等創新挑戰 情形·↓	
創新科技₽	2. 科技選用↓	 工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形・↓ 協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形・↓ 	10%

部都標準重點說叫

評審標準

評分 指標



重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)

	關之品質督	1.對專案管理、監造單位及 承攬廠商之履約管理能力。 2.監造計畫之審查紀錄、缺 失改善追蹤落實度。	簡報 P45 、	1.監造單位組織完整,近五年工程查核成績甲等86%以上且無丙等,並獲得3座金質獎;承攬廠商近五年共6件工程查核皆甲等,並獲得3座金質獎,曾獲得15、16、24屆金質獎佐證履約管理能力良好。 2.監造計畫書業經審查,原則符合規定,並於開工前核定。
品質 管理 (制度 /施工)	2. 寻采官哇	1.對監造單位及承攬廠商之 履約管理能力 2.監造計畫之審查紀錄、缺 失改善追蹤履約能力等事項 。	N/A	本案無專案管理廠商。
10%	3.監造單位之 品質保證機 制	1.監造單位之監造組織、監 造計畫、施工計畫及品質計 畫之審查、材料設備抽驗及 施工抽查、品質稽核、文件 紀錄管理系統等監造計畫執 行情形。 2.缺失改善追蹤等之執行情 形。	簡報 P47 、 P48	1.本案依監造計畫及施工規範辦理相關計畫書審查、施工抽查、稽核,並落實文件管理。 2.缺失改善亦紀錄於監造品管文件內,施工廠 商皆於契約時限內完成改善,且無發生重複 性錯誤。 3.材料設備抽驗6次、施工抽查48次,符合監造 計畫檢驗停留點,並增加隨機抽查頻率,各 項抽查、督導、查核缺失皆如期如質改善。

索引

評分 指標

評審標準



重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)

品質 管理 (制度/ 施工) 10%	4.承攬廠 商之品 質管制 機制	具計量、加工安領、加具管理標準、材料及施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統 等品質計畫	間報 P29、 P46、 P47、 P50、 P51、	 1.承攬廠商品管組織完整,依契約撰寫品質計畫,嚴密執行品質管制標準,有效提昇施工品質。 2. 材料取樣6次、自主施工檢查147次,落實自主檢查、矯正預防作為,缺失大幅減少,文件紀錄管理系統完整落實。 3. 職安衛檢查48次,重視職安危害教育訓練、交管與職安措施、防汛整備執行、防減災作為。 4、設計階段已考量工地多樣性生態棲地復育,並落實自然生態檢核,對環境保護作出貢獻。
品耐性維管 30%		考重之尚延性。 2.細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整性。 3.公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動工	簡報 P12、 P16、 P18、 P19、 P22、 P23、 P43	1.「姊妹潭」為阿里山國家森林遊樂區知名景點 ,工程採用分區分段施工,配白師 機具及材料不得堆放置開放區域,配合時 道維持施工期間園區正常營運,配戶 道維持施工期間園區正常營運, 道維持施工期間園區正常營運, 大樓 大樓 大樓 大樓 大樓 大樓 大樓 大樓 大樓 大樓

索引

部部標準重點說明



評分 指標	評審標準	索引	重點說明
 	履 1.工程施工管理之嚴謹度。 約 2.工程材料檢驗之完整性。 管 3.工程管理電子化作業運用 理 度。	回報 P35 P46、 P48、 P49、 P54、	1.主辦機關每月進行不預警現場督導。 2.本案施工期間辦理分署督導、署督導核皆獲得甲等肯定。 3.通訊軟體APP橫向溝通無虞,汛期遇雨亦第一時間回傳,主辦單位第一時間掌握現場狀況。 4.電子化工程管理,整合品質管理文件、日報、督導紀錄、估驗,提昇品質及進度管控作業。 5.施工及材料抽驗皆以TAF試驗室為主,確保品質抽驗客觀性。
維護管理 30%	管 2.提供技術移轉維護操作手理 冊及實務訓練課程,以利採 購機關後續接管運用。	簡報 P14、 P15、 P24、 P39、 P50、 P51	1.施工時為維護生態環境外,順應地形,避免大規模開挖 及縮小施工影響範圍,構造物避開珍貴林木,並於臨時 步道完工後監控生態。 2.計畫區有生態、調查及監測團隊關注,並採用最少影響 生態方式,落實生態檢核。石板部份須定期打鑿表面粗 機維持止滑效果;木構部份主要防止受潮之腐蝕等之防 治,為維護木材原有紋路和色澤,遊樂區內木構件大部 分以護木漆擦拭維護。 3.區長期有生態、調查及監測團隊關注,並滾動式檢討治 理方針。

評審標準



重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)

2.擬定施工緊急應變計畫,周延施工規畫,達成

3. 填具職安衛自主檢查表共118份,並執行職安

指標				,
防災安全	1.工地安全 衛生	工地環境衛生整潔、安全措施(安全圍籬、安全護欄、安全實施、交通管制等 安全警示標誌、交通管制等 項目之落實度。	•	1.落實工地職安作業,每日填具環保自主檢查表 共48份,達成零災害、零事故的目標。 2.每日收工前必加強工地環境衛生整潔、安全措施。
10%			66 胡	1.每日落實施工前危害告知SOP,降低意外災害

P43

P56

教育訓練6次。

索引

2.工地災害 意外災害之預防及緊急應變 預防 計畫之周延性。

許都標準重點說以



評分 指標	評審標準		索引	重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)
環境		噪音、光線、温度、空氣 維護管理之周延性。	簡報 P27、 P43、	1.施工期間開挖之碎石、材料運用太空包袋收集 裝袋並妥善置放,以防止土砂粉塵飄漫或雨水沖 刷流失及材料堆置雜亂情形發生,避免汙染施工 環境且有效降低空污產生,並臨時步道所使用之 土包袋砂石於第二工區施工時使用再利用。 2.土石不外運,妥善回填現地亦降低運送過程產 生之交通問題、碳排放量。
15%	2 生能促育	1.工程規劃階段考慮降低對生態系統之衝擊。 2.施工階段考慮對生態系統干擾。 統干擾。 3.維護階段衡量維護時機、強度、方法、材料、 範圍對動植物之影響及 對生態之干擾。	簡報 P24 P28~30	1.砌自然面塊石護坡取代一般鋼筋混凝土構造物 ,創造多孔隙環境、表面粗糙化,提供動植物 棲息環境,兼具節能減碳及生態之效益,與大 自然共存共生。 2.步道(臨時步道)施工時縮小施工範圍(減輕)並規 範施工機具寬度、避開或移植周邊林木(迴避), 提供動物棲息環境及完工後移植當地植被(補償) ,融入生態環境及周邊景觀之顯著效益。



				展業部件業及自然保局者 嘉義分署 Chayl Branch, Forestry and Nature Conservation Agency, Hinistry of Agriculture
評分 指標	評審標準		索引	重點說明
創新 科技 10%	1.創新 挑戰 性	新工法及新材料等創新 挑戰情形	簡報 P18 P22~ P23 、 P27~ P34	1.調查現有地形坡度,重新步道分段規劃,並參考建築技術規則中戶外階梯階高階深規定(2R+T≥64(CM)且 R≤18(CM)),打造符合人體工學之舒適步道。。 2.新舊石材分類配置,新購自然面砂岩石板(頂面粗糙)及舊有石板採不同溝縫大小,並施工階段石板之間採用陰溝縫方式,增加石板面排水性。 3.改善既有易積淹水區域,於步道低點增設集水井,匯流處下方埋設空心磚,將坡面逕流導、排入姊妹潭。 4.步道因年代久遠石板破裂,施工期間相關打除混凝土塊及舊有塊石等不運棄,剩餘土石塊供同期工程再利用。 5.山區氣候嚴峻(具高海拔、低溫、霧氣、高山工程再利用。 5.山區氣候嚴峻(具高海拔、低溫、霧氣氣、多爾特性),可工作日數及時數難掌握,工班於高山工作商應性亦為重大考驗。 6.阿里山閣至妹潭,步行約需10分鐘,高程差約為30公尺,搬運材料及機具困難。經前調查研究記載部分路段旁緊鄰著山椒魚出沒區,規劃設計前召開生態友善工作圈等進行審查會決定生態等級。
	2.科技 運用	1.工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形。 2.BIM(Building Information Modeling)技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形。	間取 P18 、 P32~ P33	1. 設計階段確立方向後,並以AUTOCAD做工程製圖,界面銜接優化設計;施工階段亦利用模型與承包商討論工序安排及界面銜接,降低承包商出錯機率並有效提升工進。 2. 採用全測站測量儀器測量及放樣,精準避開珍貴林木,控制構造物軸向、線形曲線完美。 3. 施工過程,豪雨期間立即回傳工地照片以利主辦機關做緊急應變措施。

