

憨吉古井花園

水林鄉蕃薯社區 環境綠美化改善工程



行政院農委會水土保持局南投分局
Nantou Branch, Soil and Water Conservation Bureau, COA.



農村風貌保存 x 歷史產業彰顯

主辦機關



水土保持局南投分局

分局長:陳榮俊

秘書:姜燁秀

課長:彭心燕

承辦:蔡欣諭

設計監造



山林技術顧問有限公司

技師:李國慶

設計人員:藍偉豪

監造人員:藍偉豪

承攬廠商

聖諭

聖諭土木包工業

負責人:洪鳳凰

工地負責人:林聖諭

品管人員:林文振

職安人員:林聖諭

維護管理
共同參與

蕃薯

蕃薯社區發展協會

理事長:吳世明

簡報 綱要

CONTENTS

- 01 工程緣起
- 02 規劃設計與工程內容
- 03 工程特色
- 04 品質管控
- 05 工程效益

PART 01

工程緣起





地理位置

- 工程坐落於雲林縣水林鄉，番薯社區為著名的傑出人才搖籃，**盛產三師**，是**書香聚落**。
- 為提供良好的讀書環境，**社區自主**將廢地古厝改造優雅的讀書室。





許多位司法官等司法人員及醫師、公務人員而聞名



番薯社區為著名的傑出人才搖籃，盛產三師





元宵節蕃薯村街道情形



射火馬除瘟疫



元宵節順天宮前方盛況

- 1747年乾隆年間就建立了順天宮
- 元宵慶典活動擁有百年歷史且雲林最大規模
- 四天三夜不停歇的鞭炮煙火
- 蕃薯寮媽夜巡特有的「射火馬」、「面桶炮」傳統活動

關鍵議題2 水保局工程進駐，促進小花連鎖反應



工程位置

雲155

蕃薯社區圖書室

蕃薯農場

狀元咖啡

慈吉運動公園

慈吉運動公園

慈吉客棧

慈吉客棧

玄太子會

水林鄉蕃薯厝順天宮

水林鄉蕃薯順天宮

蕃薯村1,025人，
65歲以上人口：225人，
佔近22%
超高齡化社區

農塘生態公園



社區居民看見自己家園旁邊荒廢了半世紀的窳陋空間改變了，
兩年內便有一連串連鎖的小花效應繼續開花



關鍵議題



開鑿故事



狀元村

- ✓ 展現社區的文化歷史意涵
- ✓ 融合現存的農村聚落景觀

蕃薯寮媽文化及空間資源串聯



順天宮



宗教慶典

規劃設計原則

戶外場域

- 建構全齡友善空間之營造
- 民眾隨手可得的圖書跳島
- 產業蕃薯與歷史故事導覽


融合文化

- 保有蕃薯社區濃厚的鄉村氣質
- 環保綠建材建構降低環境衝擊
- 順應大喬木分布尊重原生環境



青仔埕公園

運動公園

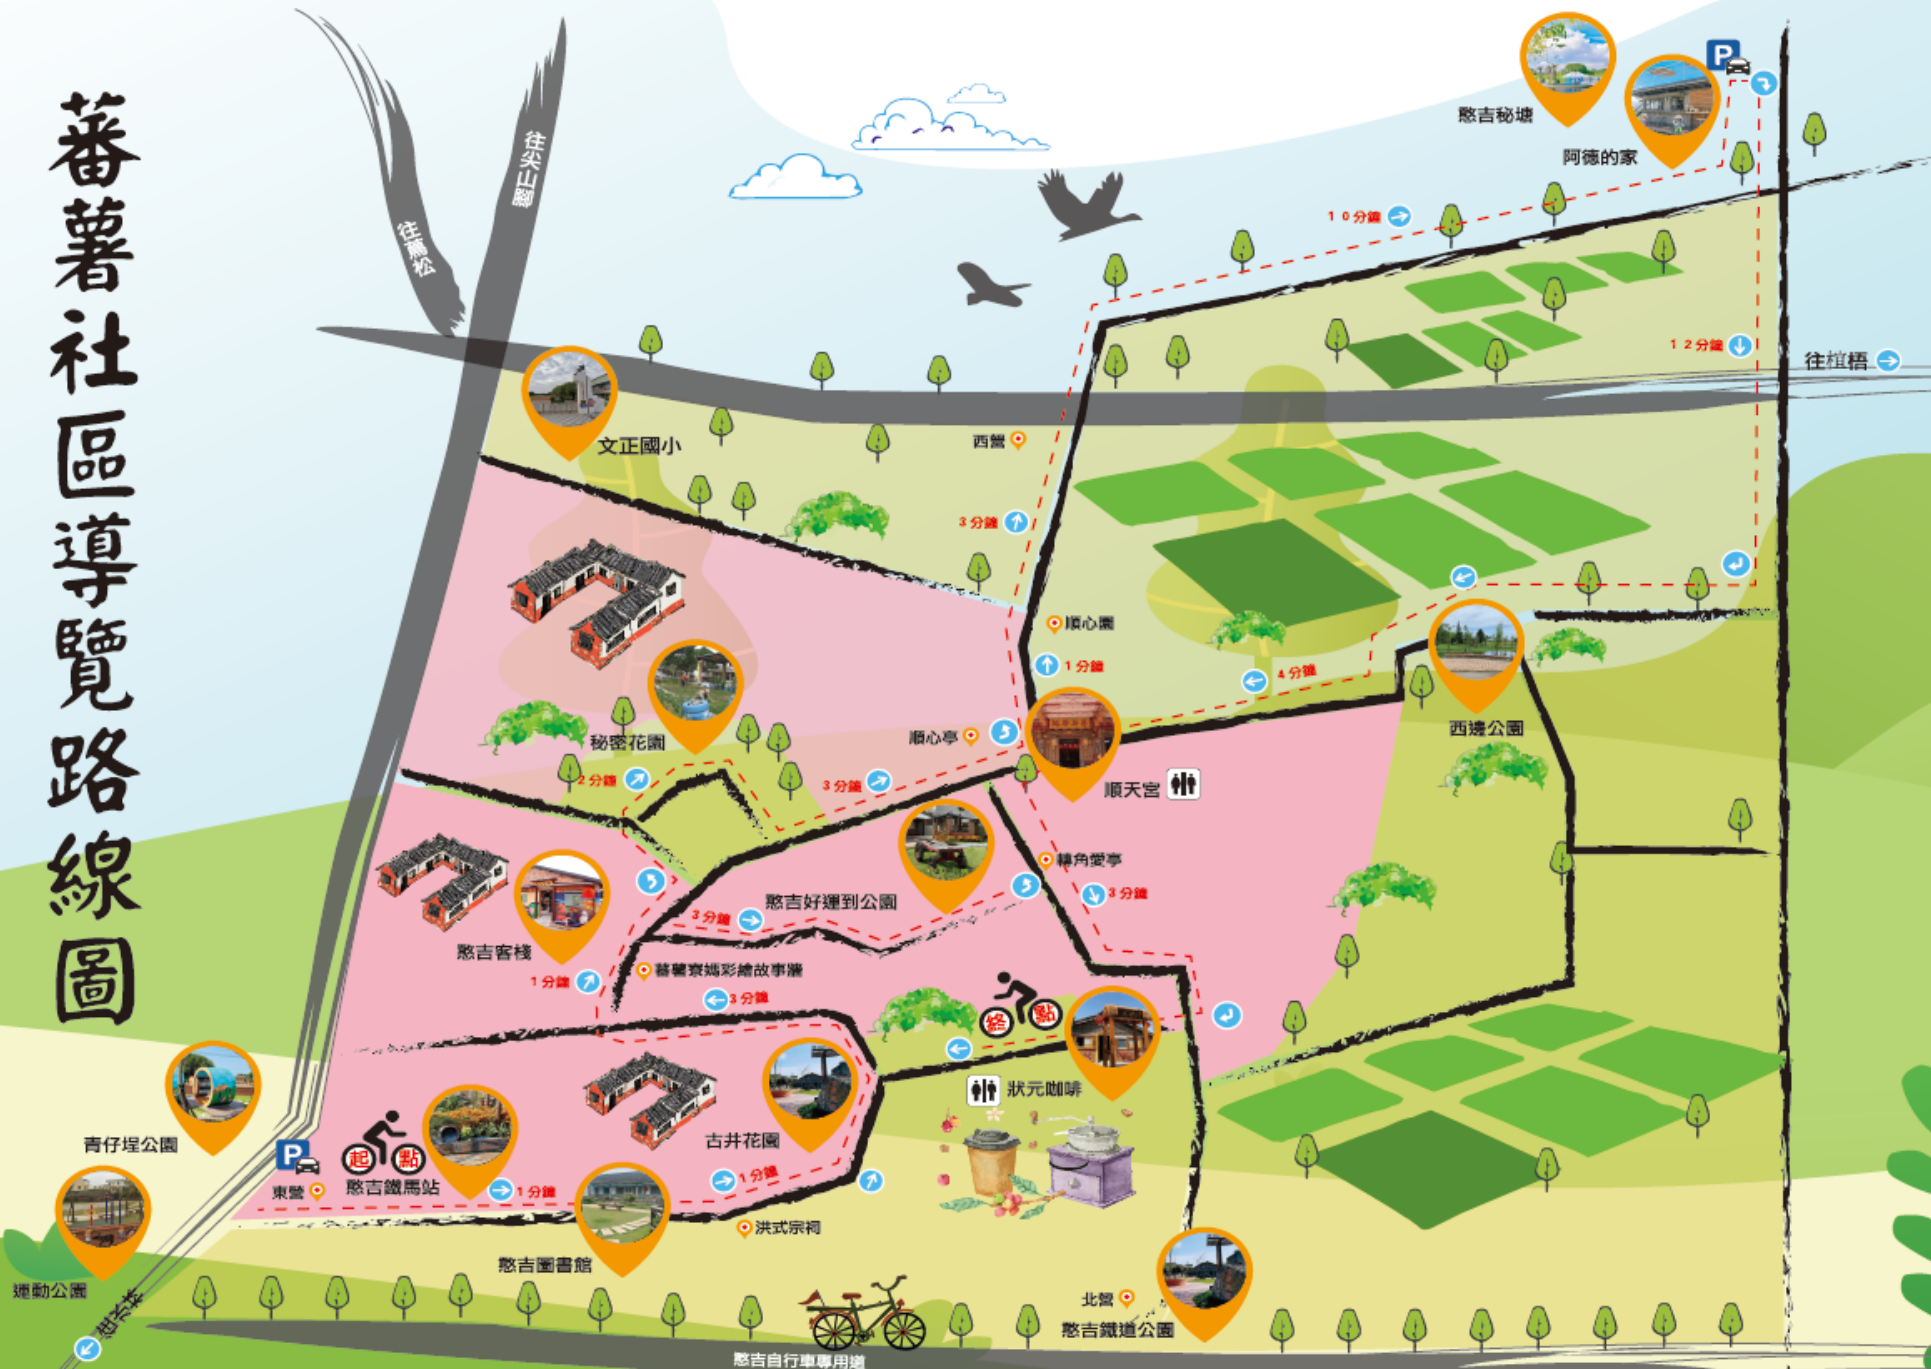


 愍吉鐵馬站(起點)

- [illegible]

全程約45分鐘

- ✓ 位於蕃薯村中心
- ✓ 步行至順天宮5min
- ✓ 步行至關懷據點3min
- ✓ 步行至狀元咖啡1min

選址

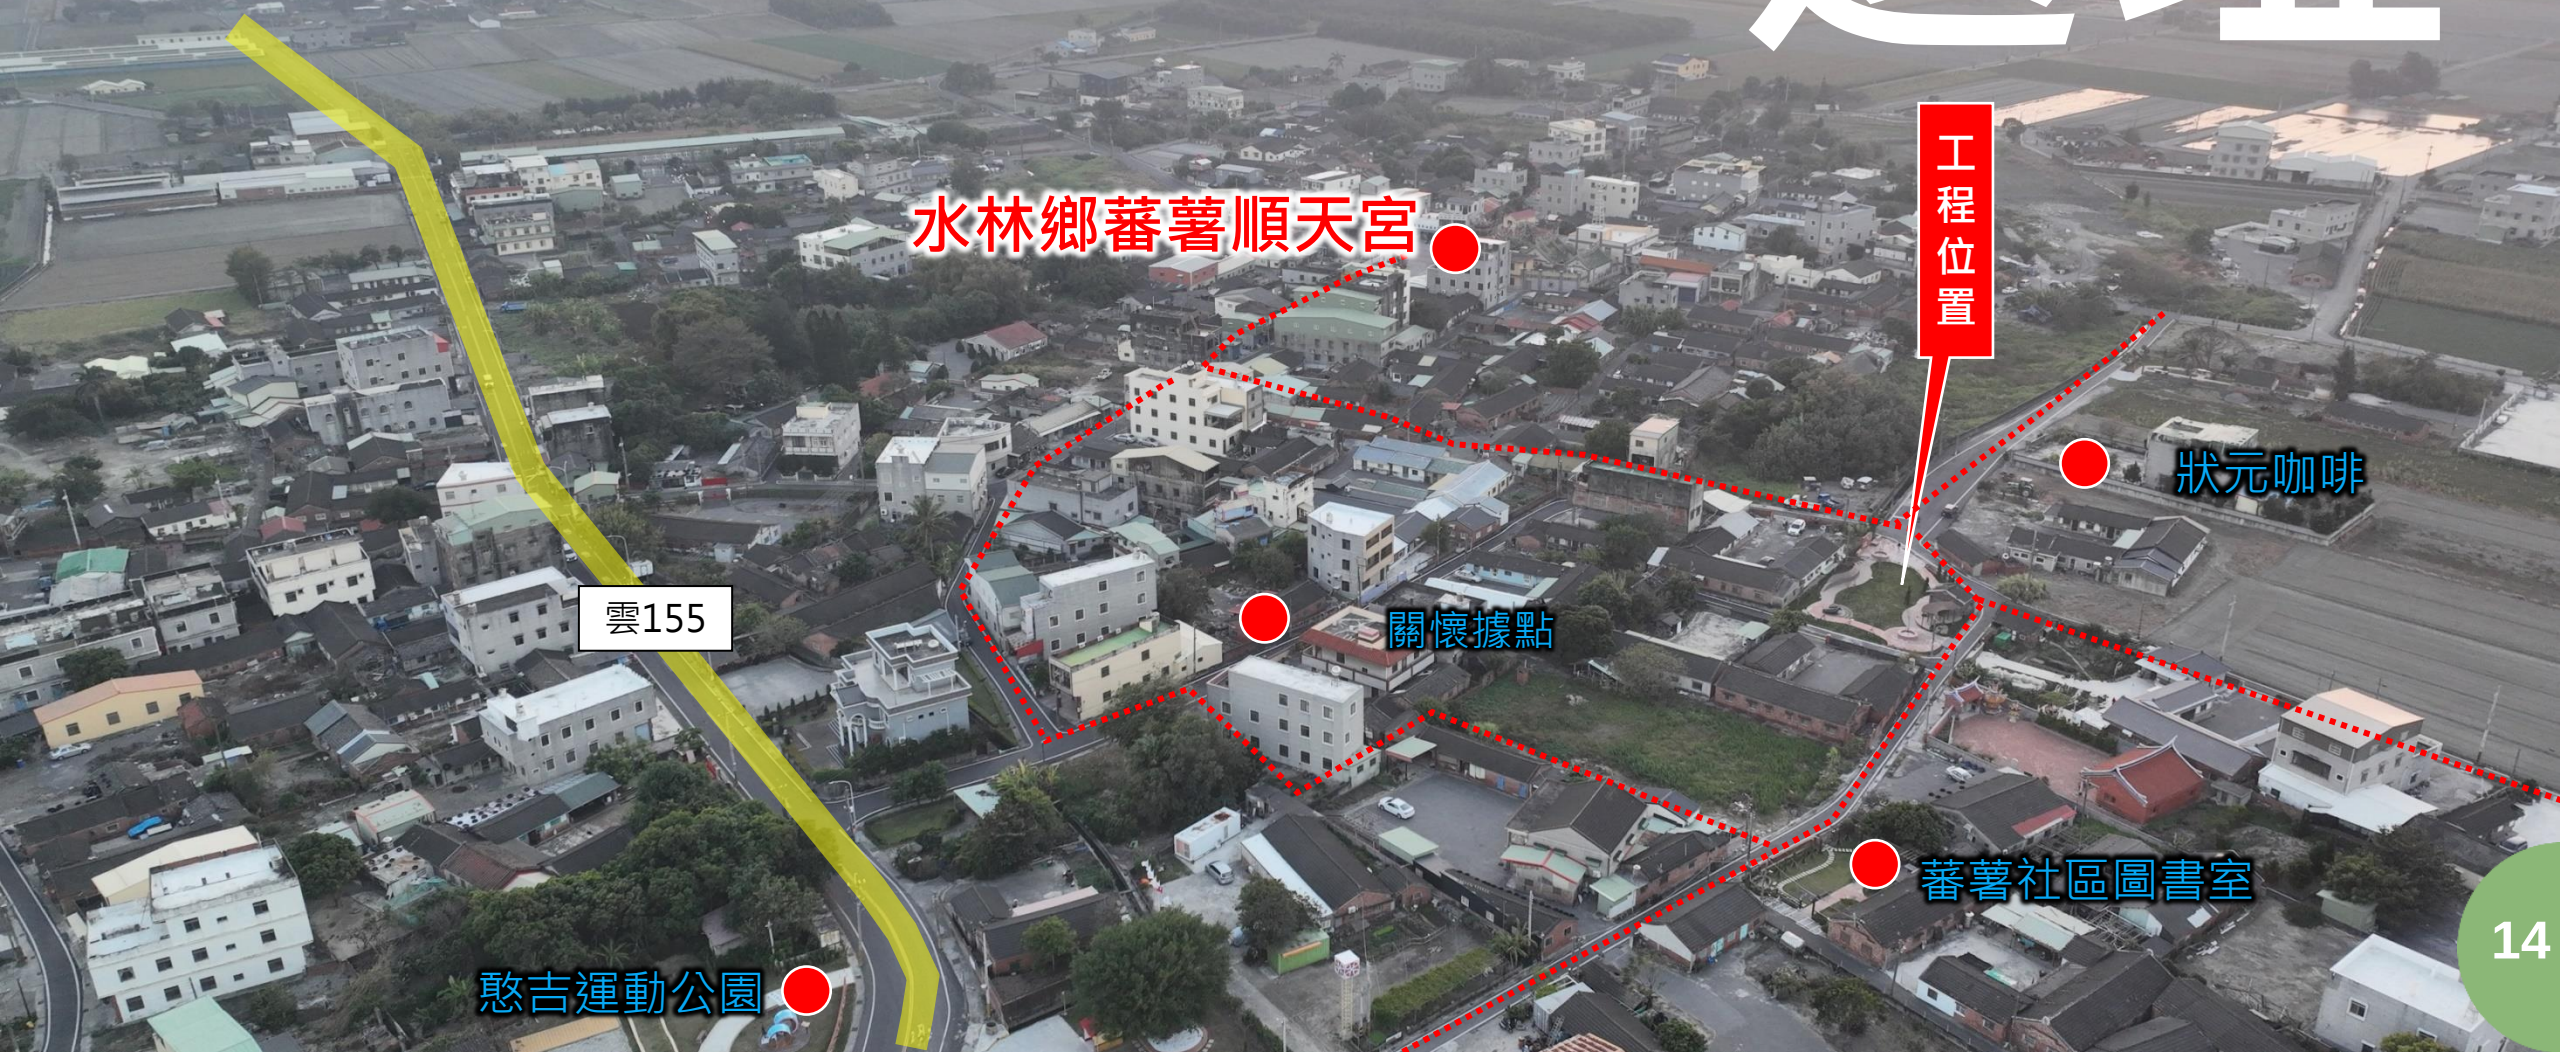



工程內容

因地制宜，零工安，如質如期完工

工作團隊	主辦機關：行政院農業委員會水土保持局南投分局 設計監造：山林技術顧問有限公司 施工單位：聖諭土木包工業
主要工項	社區需求設施 :入口廣場、清水磚步道、仿木平台、仿木花架、仿木步道暨座椅廊架 休憩座椅 友善生態措施 :草溝、植生工程 人文藝術設施 :銅雕裝置藝術、古井藝術牆牆面美化、陶磚造型牆、造型鋼板
履約期限	開工日期：110年05月08日 竣工日期：110年12月31日(提前完工) 施工天數：148日曆天(核定天數150日曆天)
工程經費	契約金額新台幣5,974,500元 結算金額新台幣5,974,500元



主辦單位品質稽查確實改善



主辦無預警抽查 110/07/21



主辦無預警抽查 110/09/06



主辦無預警抽查 110/10/01



南投分局稽查 110/10/25



南投分局稽查 110/11/05



農委會查核 110/10/28

主辦機關督導

6次

農委會查核

1次

工程品質稽查及督導情形

主管機關督導情形

農委會110.10.28查核 → 甲等82分

- 1.馬路側向內、花磚牆施工平整、線形佳與周邊視覺協調。
- 2.書香迴廊曲線座椅及步道曲線優美。
- 3.仿木步道曲線佳。
- 4.仿木平台表面整齊，切割完整。
- 5.自主品管檢查報表填寫尚佳。
- 6.施工人員皆有戴安全帽。
- 7.工程告示牌設立完整。

主辦機關稽查並落實改善

- 主辦人員不定時辦理品質稽查6次。
- 查核、督導所列缺失，均列管追蹤，並依限改善完成後備查。



110.10.25



南投分局內部稽查



110.10.28 農委會查核





設計監造單位報告

古井花園

蕃薯社區

基地課題



社區重要的道路節點，雜草叢生



既有草溝無法發揮排水效能



閒置古厝，無人使用屋頂恐坍塌



古人取水古井被雜木淹蓋



憨吉古井花園

項次	困境分析 (現況問題)	設計對策
1	低量開發社區	無障礙全齡友善空間建構
	農村風韻猶存	休憩座椅設置
2	開鑿歷史文化 宗教傳承相扣	融入社區傳統童玩特色的安全紅磚牆，古厝夠古夠純夠濃，保有傳統農村氣質

農村風貌保存 x 歷史產業彰顯

PART 02


規劃設計 工程內容



這是一口四角古井，開鑿至今已具近百年歷史，是當時居民珍貴的飲水來源，味道甘美，水源豐沛，甚至常常溢出井口，實是一口好井。



空間配置構想

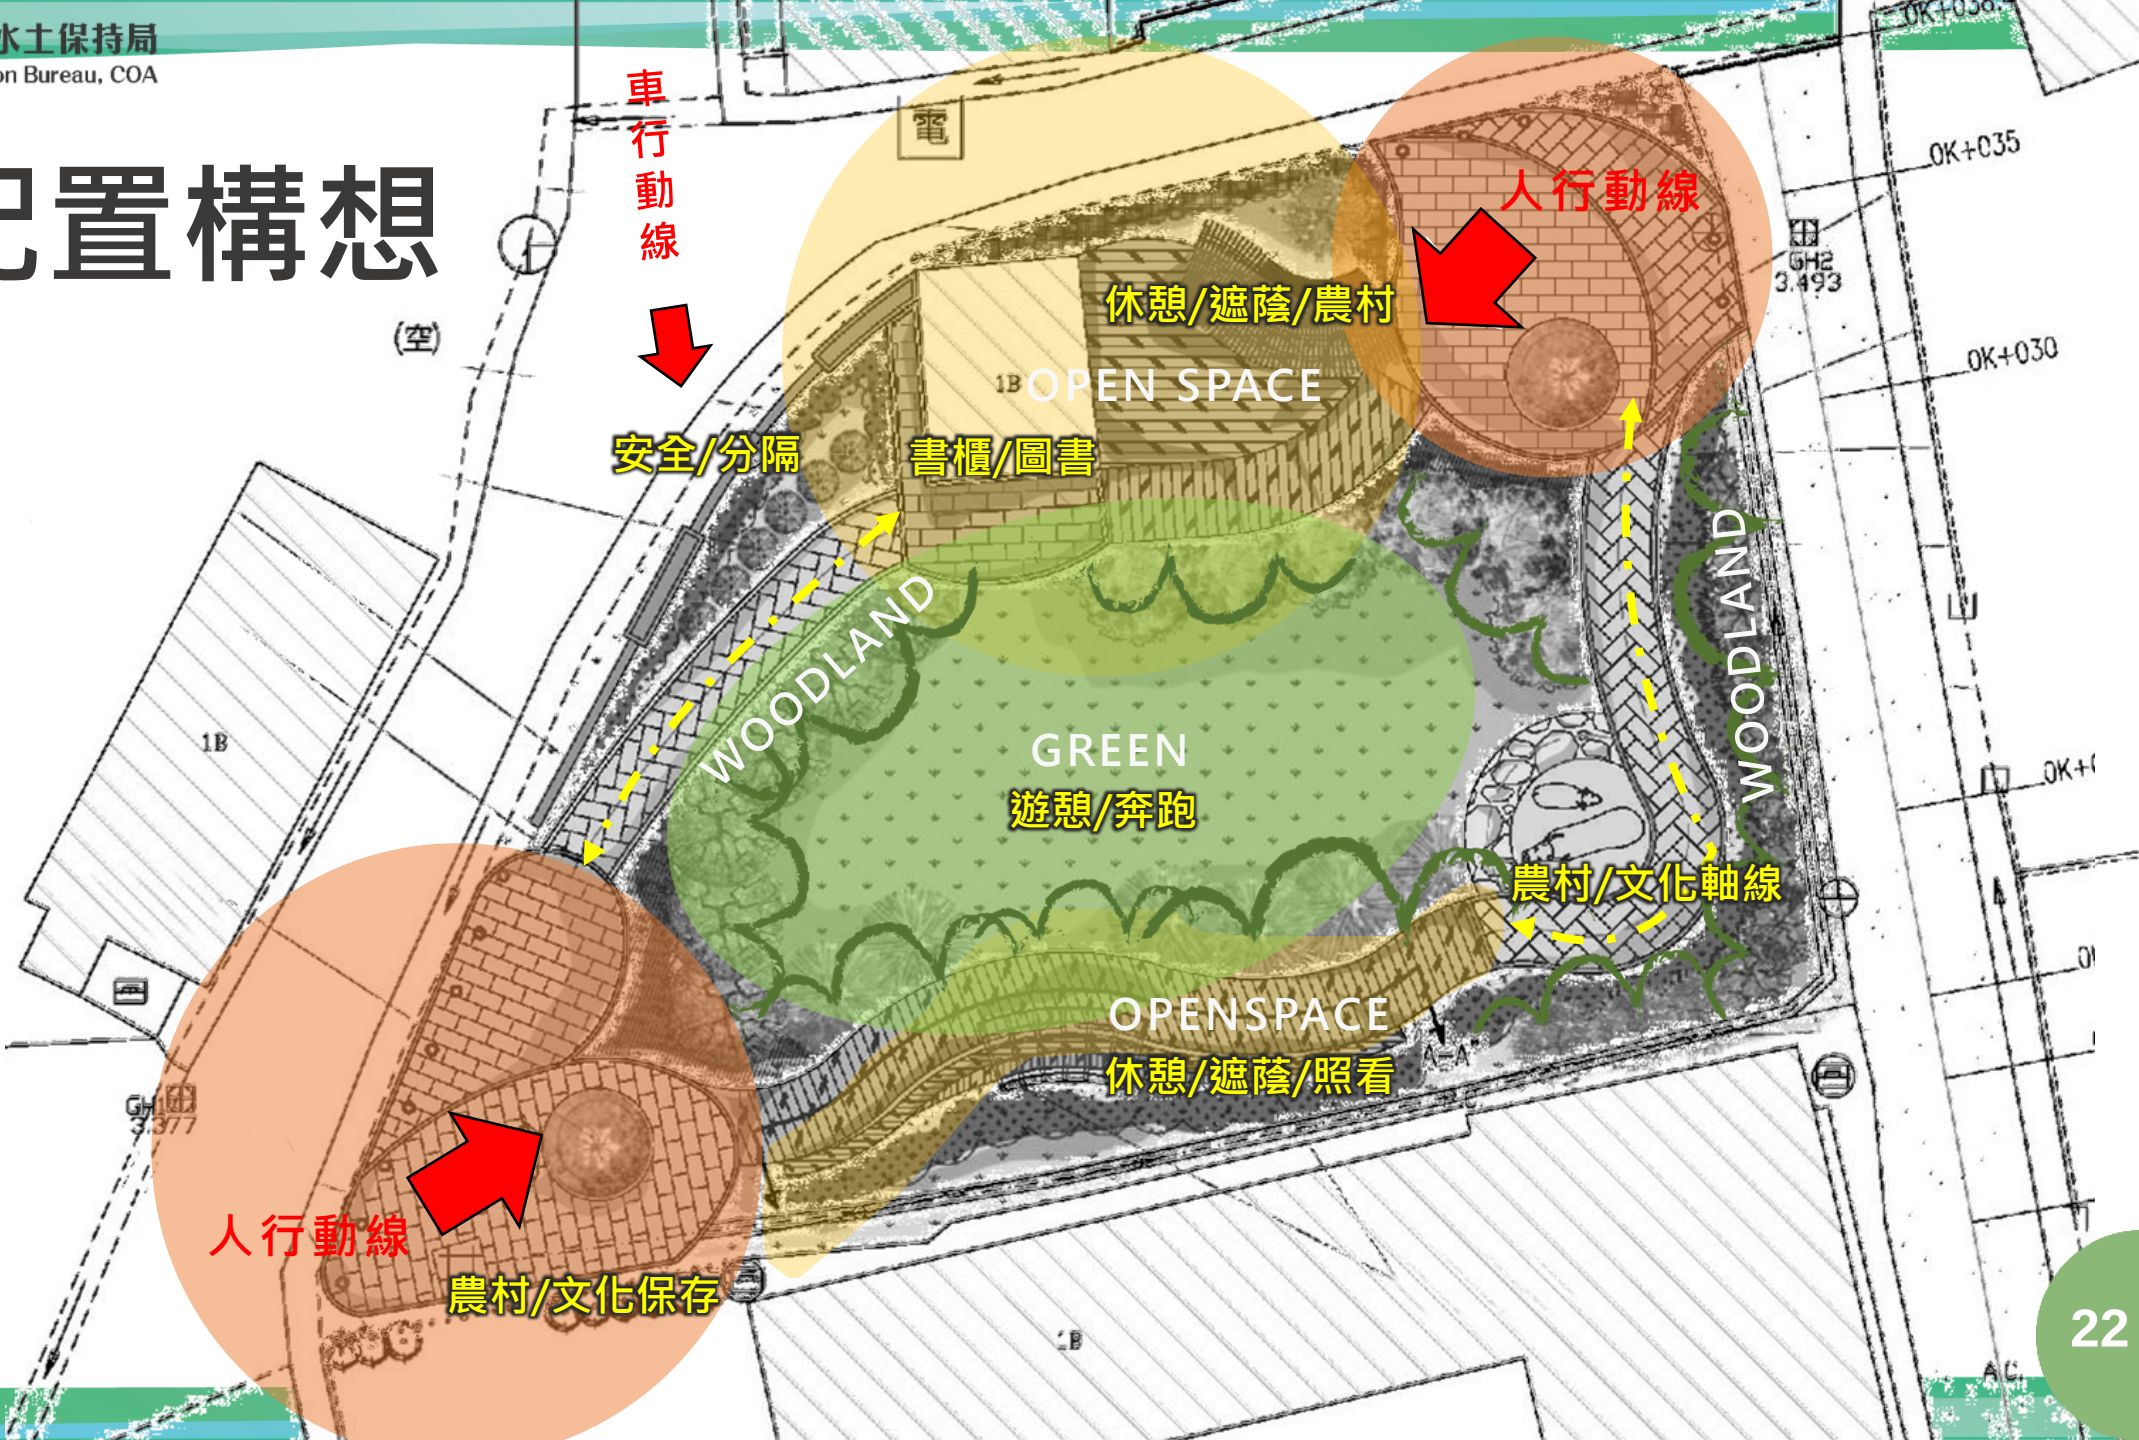



工程內容

社區需求設施

- 1.入口廣場
- 2.清水磚步道
- 3.仿木平台
- 3.仿木花架
- 4.仿木步道暨座椅廊架
- 5.休憩座椅

友善生態措施

- 1.草溝
- 2.植生工程

人文藝術設施

- 1.銅雕裝置藝術
- 2.古井藝術牆
- 3.牆面美化
- 4.陶磚造型牆
- 5.造型鋼板



契約金額：5,974.5千元

縱橫雙向漸變式設計



書香迴廊正向剖面圖

- 座椅採縱橫雙向漸變式設計，施工難度高。
- 選用暖色調材質塑木，提供多元使用及延長使用年限。
- 採用麻繩網材質，避免攀藤植物溫度過高不易生長攀爬。




細部設計-休憩平台 全齡友善設計



雙向出入無障礙環境營造



雙向出入無障礙環境營造



仿木平台斷面圖

- 平台出入口處設計雙向無障礙坡道，設計坡度1:12，符合法規規範。




細部設計-安全退縮 適宜寬度，留設綠帶

考量安全性進行退縮，
並保留綠帶空間植生復育



細部設計-視覺穿透 減少視覺盲點

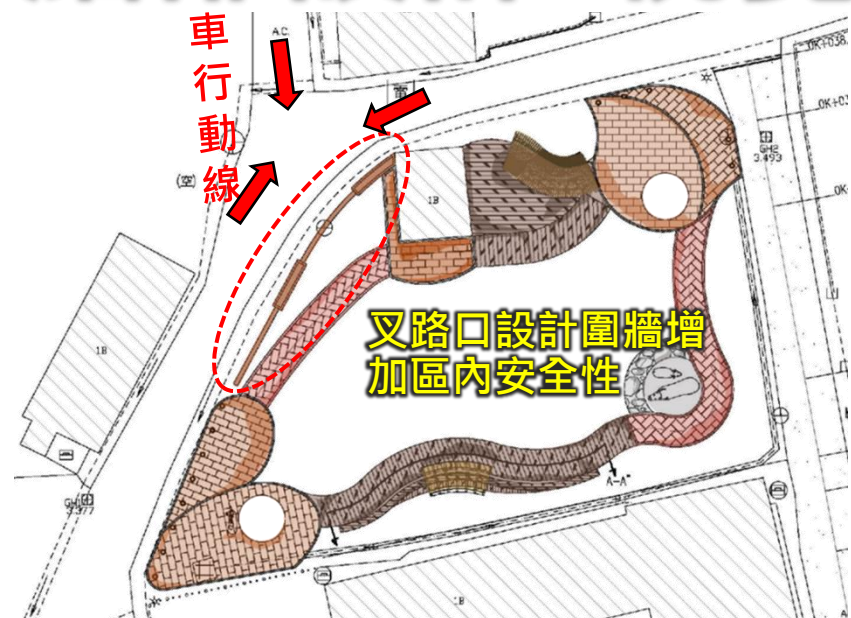

- 考量三向路交會點，以高低弧形造型牆做為區隔，提高用路人視覺穿透性，降低行車所產生的盲點，確保民眾安全。



弧形高低設計減少視覺盲點





細部設計-農村元素應用

傳統窗花、陶磚、清水磚



- 材質選用與紅磚相似性質清水磚、陶磚營造，達到整體景觀與農村風情融洽。
- 結合傳統花磚特色，並增加整體視覺通透感。






細部設計-銅雕 大小牛意象，家家戶戶好收成



- 採用銅雕，相較一般材質意象，大幅提升使用年限及管理維護。
- 融入當地農村特色，結合社區人文教育導入。



細部設計-牆面美化 村內整體景觀一致性高

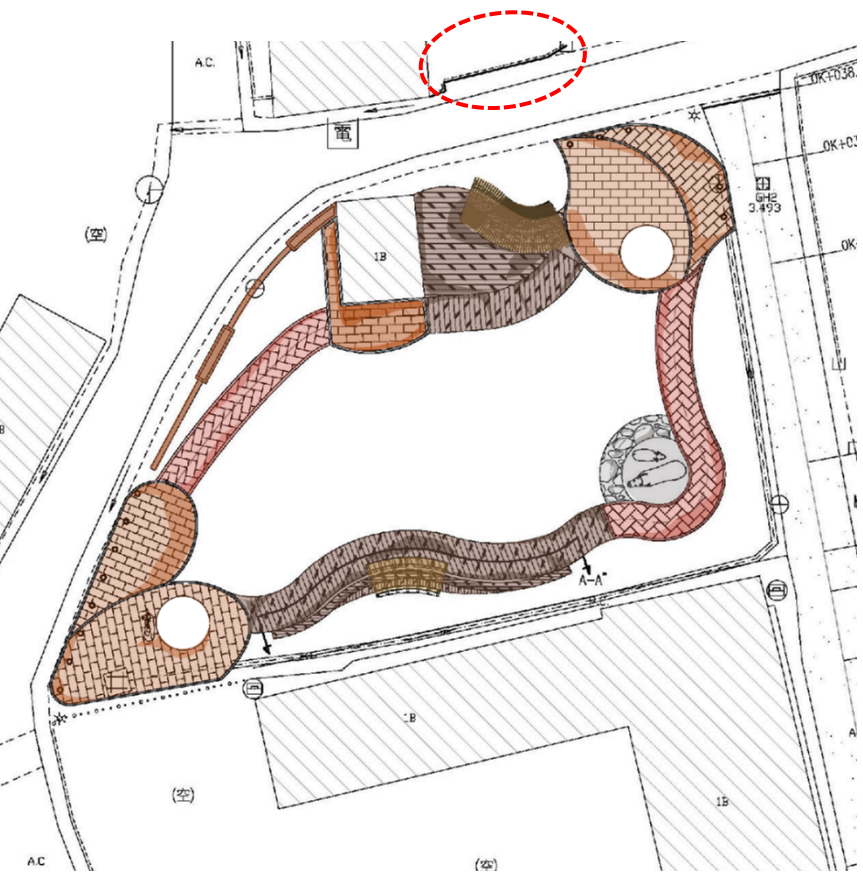

- 延伸水土保持局109年度於社區環形動線起點之元素，美化周邊圍牆，使周遭環境整體串聯。

優質 · 效率 · 團隊





細部設計-植栽配置 物種多樣性

喬木類:



1. 黃金串錢柳



2. 藍花楸



3. 花旗木



4. 紅花風鈴木



5. 樟樹



6. 蘭嶼羅漢松



7. 龍柏

灌木類:

1. 月橘

2. 流星變葉木

3. 黃鐘花

4. 紅花玉芙蓉

攀藤地被類:

1. 炮仗花

2. 錫葉藤

3. 百慕達草



PART 03

工程特色





周延性(1/4) 傳統建築元素融入，營造濃厚的農村情懷





周延性(2/4) 長幼友善，全齡無障礙設計



無障礙通路暢行無阻



長幼友善動線



周延性(3/4) 飲水思源-百年古井重現



既有百年古井



古井重新活化



飲水思源

提供社區結合教育導覽

百年古井重新活化，藉由牆面導覽解說打造新地標




周延性(4/4) 延續營造風格，整體景觀一致性





挑戰性(1/3) 三叉路口謹慎考量配置圍牆，安全景觀兼顧

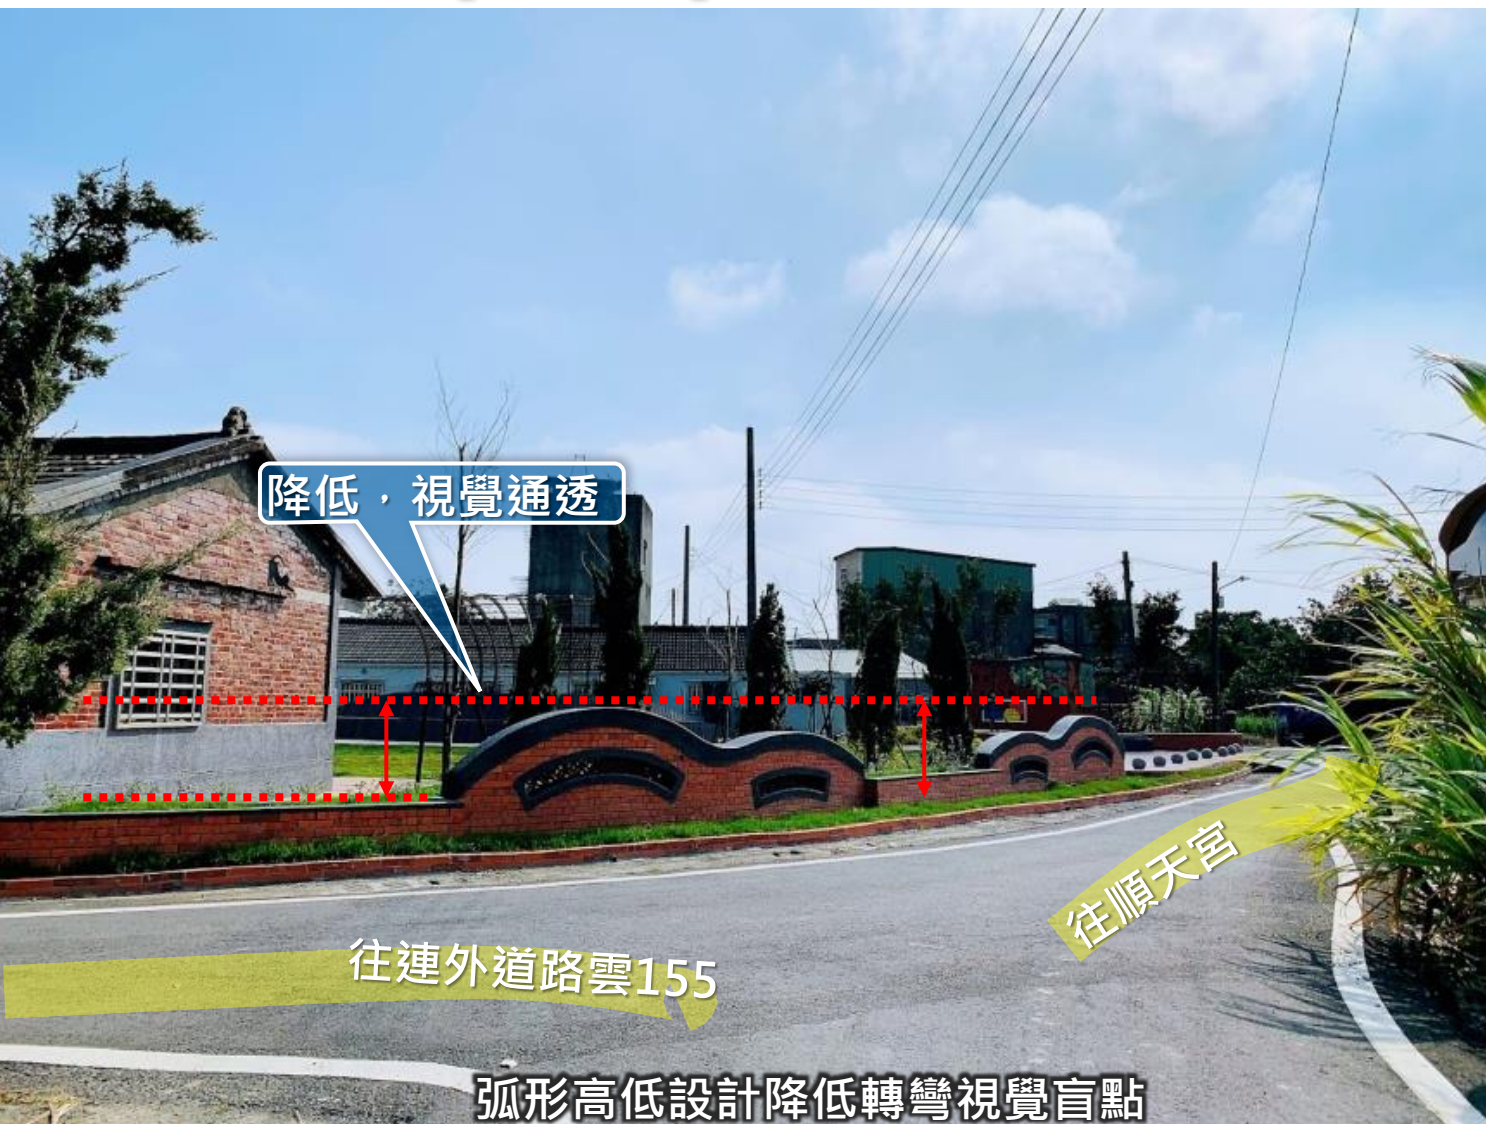



挑戰性(2/3) 公民共同參與，介面協調溝通

社區自行彩繪



意象造型鋼板(本案)



夜間照明社區建置

建物社區整理



建物原始屋況



民眾掛燈籠點綴



挑戰性(3/3) 疫情期間雛型到成形三方反覆溝通細節

小模形體討論



小模雛形



小模校正



小模定稿確認

大模細節微調



大模開模製作



大模完成



成品照



有效性(1/2) 365天，有3/4開花綻放

名稱	常綠	落葉	花香	花色	花期												
					春			夏			秋			冬			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
黃金串錢柳	●		●	白色					●	●	●	●					
藍花楸		●		藍色			●	●									
花旗木		●		粉紅色		●	●										
紅花風鈴木		●		洋紅色	●	●	●										
樟樹	●			黃綠色	●	●	●										
蘭嶼羅漢松	●			黃綠色		●	●										
龍柏	●			黃綠色		●	●										
月橘	●		●	白色	●	●	●				●	●	●				
流星變葉木	●			黃綠色								●	●				
紅花玉芙蓉	●			紫紅色				●	●	●	●	●	●				





有效性(2/2) 環保塑木，回收再製


永續

使用再生塑料、回收木粉

減少森林砍伐
取代實木



REUSE
REDUCE
RECYCLE



全區使用塑木413才，總計回收廢棄 HDPE+PP 185才
廢棄塑膠再製再利用，再生塑木的運用，減少對樹木砍伐

循環經濟，廢塑膠再利用

PART 04

品質管控




監造組織

★ 簽證技師：李國慶
證號：技執字第006408號

★ 設計人員：藍偉豪

★ 監造人員：林詩穎
品管證號：第IE1060420 號

★ 監造協辦人員：藍偉豪
品管證號：第IE1060421號

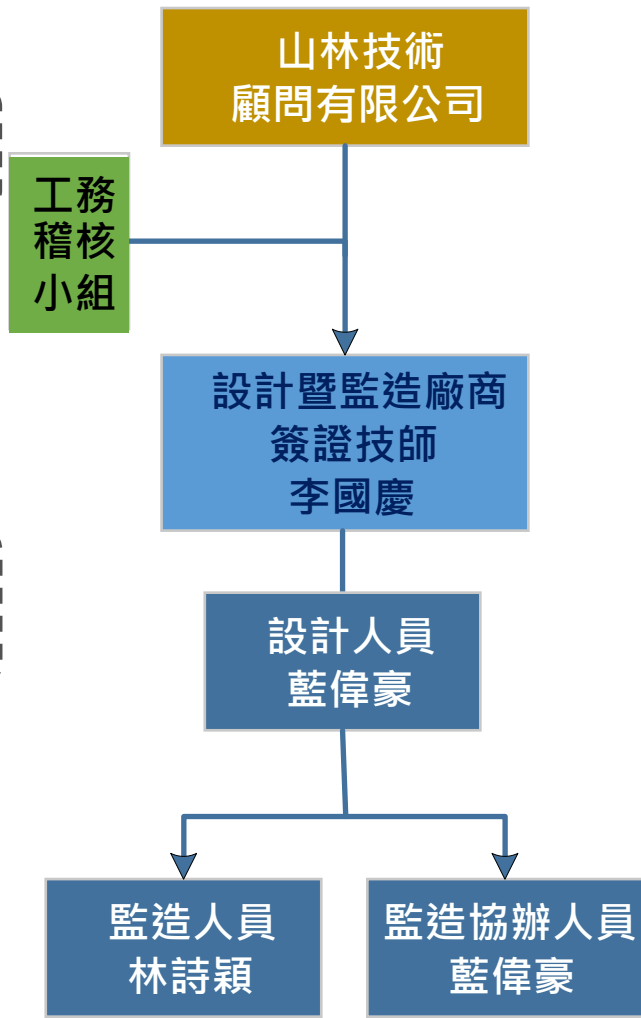


進度管理

開工日期：
110年05月08日

預定竣工日期：
111年1月3日

竣工日期：
110年12月31日

工期：
150日曆天

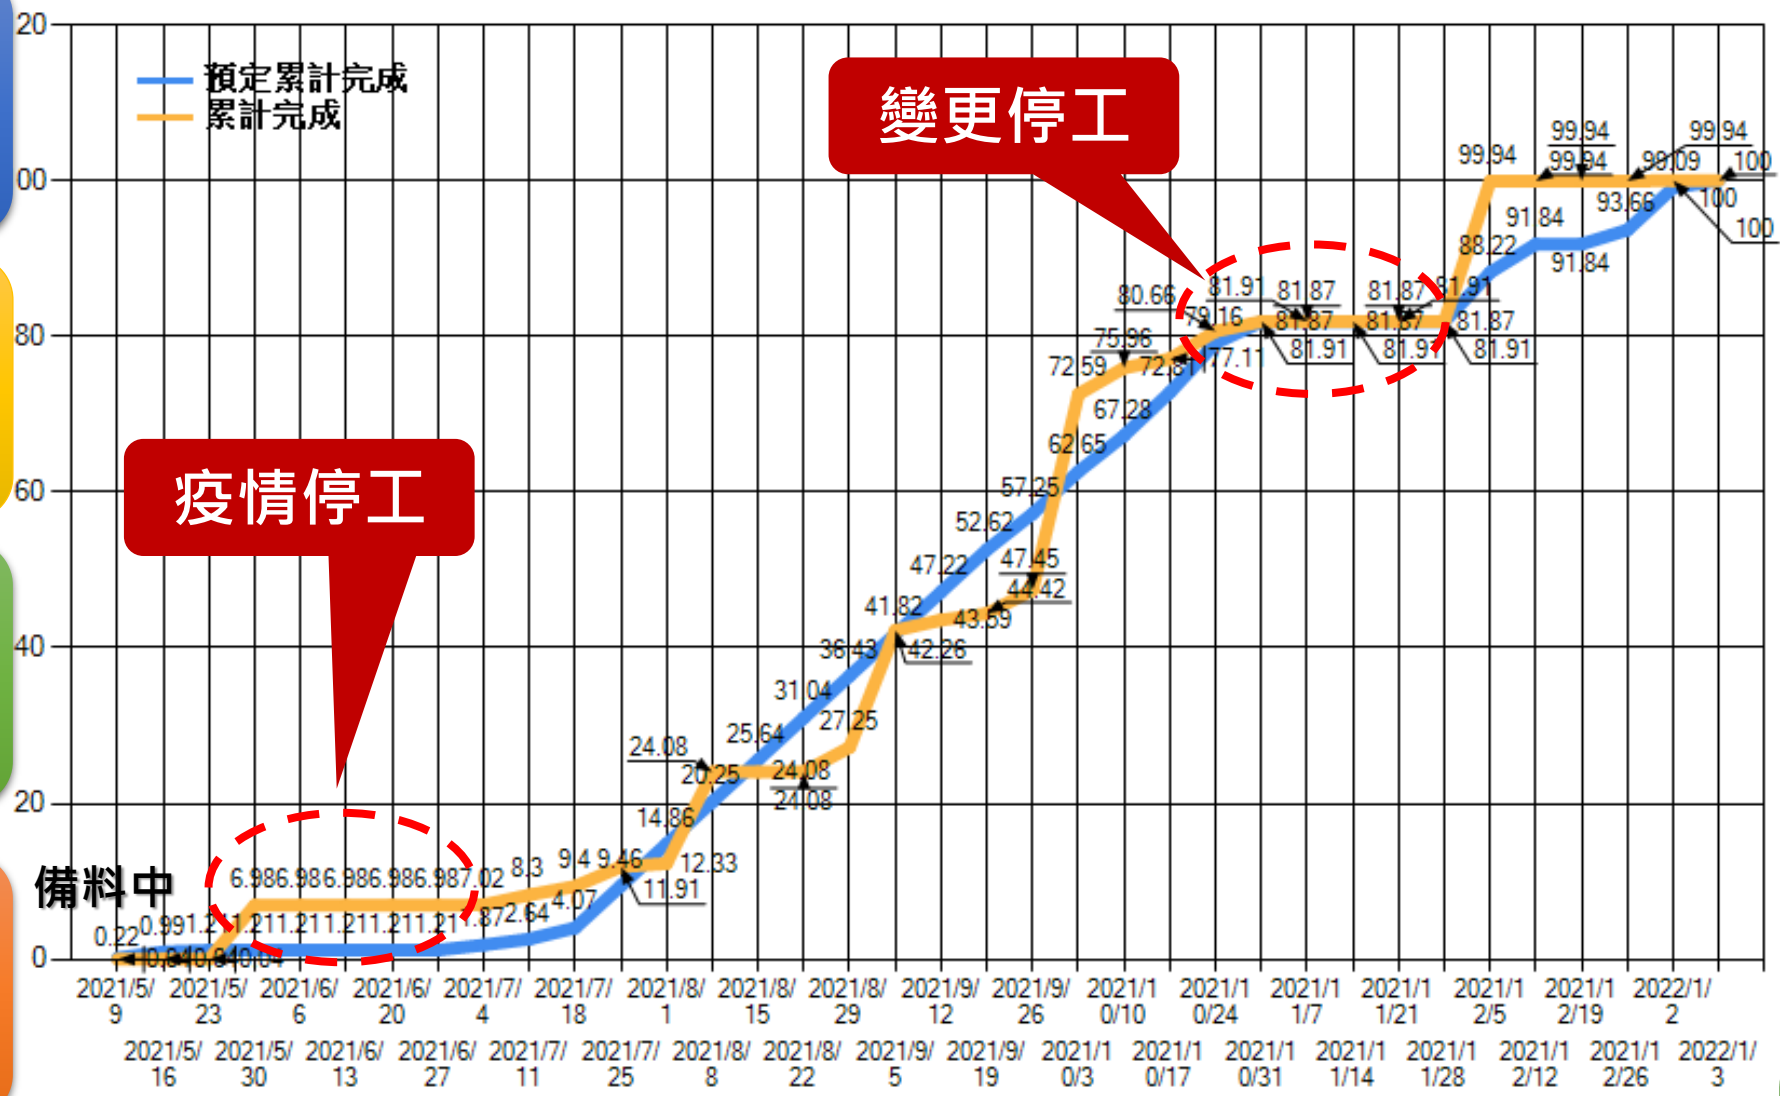




品質管控

開工日期：110.05.08

序號	文件名稱及審查	日期	備註(文號)
1	監造計畫送審	110年 04月22日	(110)山林字第1100422002號
	主辦機關核定日期	110年 05月03日	水保投農字第1101961945號
2	施工計畫、品質計畫送審	110年 05月04日	(110)山林字第1100504011號
	主辦機關備查日期	110年 05月06日	水保投農字第1101961988號

工程名稱：水林鄉舊社區環境綠美化改善工程
工程序號：110RA-01-051

施工及品質計畫



主辦機關：行政院農業委員會水土保持局南投分局
承攬廠商：聖翰土木包工業
監造單位：山林技術顧問有限公司

中華民國 110 年 4 月

施工及品質計畫核定

施工及品質計畫送審審查表(委外監造)

工程名稱：水林鄉舊社區環境綠美化改善工程
契約編號：110RA-01-051

提報次數：第 1 次 提報日期：110年5月3日

蓋公司章 簽章欄

負責人：洪國恩
工地負責人：許其強
品管人員：林其強

審查結果

☐ 依審查表所提修正意見重新提報
(限期提報日期：年 月 日)

☒ 審查符合 核符合日期：110年5月3日

蓋公司章 簽章欄

監造單位

☐ 依審查表所提修正意見重新提報
(限期提報日期：年 月 日)

☒ 同意核定 核核定日期：110年5月3日

簽章欄

主辦人員 課長
秘書 副分局長 分局長

中華民國 110 年 5 月 3 日

皆於開工前完成核定

監造計畫

工程名稱：水林鄉舊社區環境綠美化改善工程
契約編號：110RA-01-051

提報次數：第 1 次 提報日期：110年4月22日

蓋公司章 簽章欄

監造單位負責人：林其強
監造技師(或建築師)：林其強
監造工地負責人：林其強

審查結果

☐ 依審查表所提修正意見重新提報
(限期提報日期：年 月 日)

☒ 同意核定 密核定日期：110年4月28日

簽章欄

主辦人員 課長
秘書 副分局長 分局長

工程主辦機關：行政院農業委員會水土保持局南投分局
監造單位：山林技術顧問有限公司

中華民國 110 年 4 月

監造計畫核定

監造計畫送審審查表(委外監造)

工程名稱：水林鄉舊社區環境綠美化改善工程
契約編號：110RA-01-051

提報次數：第 1 次 提報日期：110年4月22日

蓋公司章 簽章欄

監造單位負責人：林其強
監造技師(或建築師)：林其強
監造工地負責人：林其強

審查結果

☐ 依審查表所提修正意見重新提報
(限期提報日期：年 月 日)

☒ 同意核定 密核定日期：110年4月28日

簽章欄

主辦人員 課長
秘書 副分局長 分局長

中華民國 110 年 4 月



監造技師及監造人員現場督導查驗



鋼筋抽查

110/07/09



平台高程抽查

110/07/16



工地密度抽查

110/07/16



技師現場督導

110/08/31



安衛人員落實安全講習

110/11/12



鋼構間距抽查

110/09/15



材料進場抽查

110/09/30



主辦現場狀況討論

10/10/01



車輛清洗抽查

110/11/20

次數	監造技師督導日期
1	110/07/07
2	110/08/31
3	110/09/30
4	110/10/15
5	110/11/18
6	110/12/07

材料設備查驗管制總表

抽驗項目	已抽驗 次數	符合 次數	未符合 次數
混凝土圓柱試體抗壓	1	1	0
鋼筋抗拉、抗彎	2	2	0
工地密度	2	2	0
土壤夯實	1	1	0
面磚抗壓	1	1	0
瀝青混凝土壓實度	2	0	0
瀝青混凝土含油量	1	0	0
瀝青混凝土篩分析	1	0	0
瀝青混凝土比重密度	1	0	0

共計試驗
9項工項

試驗工作
共計12次

未符合次數
0次


100%
全數合格




圓柱試體取樣



工地密度試驗

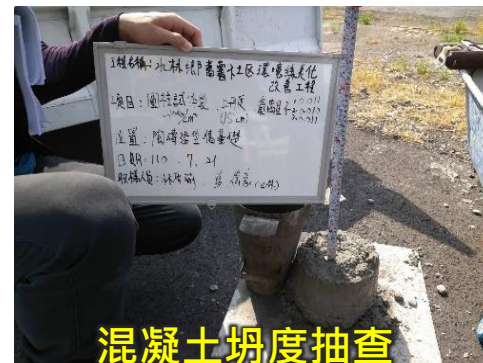

混凝土坍度抽查

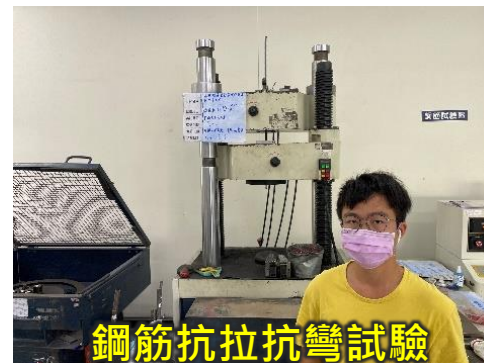

鋼筋抗拉抗彎試驗



混凝土氯離子抽查



圓柱試體抗壓試驗

監造單位查驗紀錄管制總表

抽驗項目	已抽驗次數	符合次數	未符合次數
施工放樣	3	3	0
開挖工程	6	6	0
模板工程	4	4	0
鋼筋工程	4	4	0
混凝土工程	5	5	0
回填工程	2	2	0
鋪面工程	3	2	1
仿木工程	8	5	3
藝術牆工程	2	2	0
裝置藝術工程	1	1	0
砌陶磚工程	1	1	0
牆面美化工程	2	2	0
植栽工程	1	1	0
工地安全衛生	11	11	0
工地環境保護	11	11	0
生態友善檢核	6	6	0

共計查驗
16項工項

查驗工作
共計70次


未符合次數
4次(已改善)



藝術牆基礎鋼筋抽查



仿木座椅開挖抽查

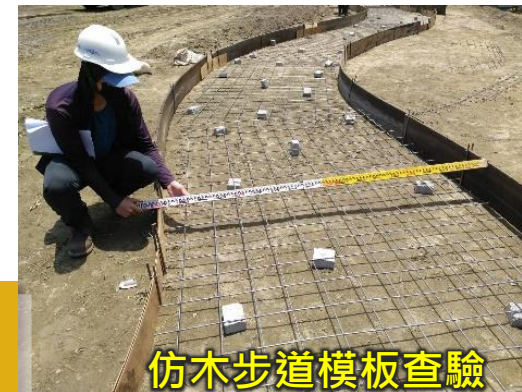

仿木步道模板查驗



陶磚造型牆開挖抽查



仿木花架基礎查驗



廊架鋼構組立抽查

缺失改善追蹤紀錄

表 5-4 不符合事項追蹤改善表

工程名稱：水林鄉蕃薯社區環境綠美化改善工程 日期：110 年 10 月 19 日

監造單位：山林技術顧問有限公司 檢驗日期：110/10/19

執行改善單位：聖餘土庫包工業 預定改善完成日期：110/10/20

缺失具體情形(由監造單位填寫)：
清水磚步道及廣場鋪面銜接處銜接不順。

要求改善單位採取改善及預防措施(由監造單位填寫)：
派員改善。

監工人員簽名：林明強

缺失發生原因及採取預防措施(由承包商填寫)：
此項缺失係因施工前未做好圖面檢討所致
預防措施：爾後於各工程項目施工前確實做好圖面檢討以防止再有類似施工不
平順之情況產生

採取改善措施(由承包商填寫)：改善完成日期：110/10/20
將不平順之收邊線石缺角要求泥作人員切割清水磚材料成斜角施工，使之平順銜
接。

承攬廠商代表簽名：林明強 品管人員：林明強 工地負責人：林明強

缺失改善成果確認(本欄由監造單位填寫)

改善後檢核日期：110/10/20

改善結果確認：
☒改善完成
☐未完成改善(再填寫本表)
☐其他

複檢人員簽名：李俊 監造主管簽名：林明強

備註：本表需併同 1.改善後檢驗紀錄表 2.改善前、中、後照片 3.原檢驗紀錄表存檔

表 5-4 不符合事項追蹤改善表

缺失事項：清水磚步道及廣場鋪面銜接處銜接不順。

工程名稱：水林鄉蕃薯社區環境綠美化改善工程

缺失改善前、中、後照片表

改善前：	
改善中：	
改善後：	

備註：須貼改善前、中、後同一角度所拍攝之照片

改善前

開具不符合事項通知暨改善表，通知施工廠商改善

改善中

施工廠商將不合格事項改善並提出矯正預防措施

改善後

監造人員複查，如複查合格，留存紀錄、歸檔備查

履約管理-工程管理電子化

- ◆督導施工廠商傳輸數位相片，並於<http://rcm.swcb.gov.tw>運作「進度實績管理子系統」及「委外監造日誌回傳系統」。



- 遠端品質回傳
- 進度實績管理
- 進度落後預警
- 遠端填報進度

●三級品管電子化遠端系統-科技運用



社區強化 完工後社區民眾自主動手點綴古井花園



本工程造型鋼板社區自行彩繪



發展協會動員民眾掛燈籠點綴



為老屋整理，成了民眾聚集聊天場所



打造永續工程，維護管理不煩惱

即時維護

社區宣導維護

居民自主維護

通報維護

居民通報

社區專線通知

包括公物破損、修繕等，
由全民通報，蕃薯社區立
即派工維護。

立即維護

雲林縣水林鄉蕃薯社區發展協會



雲林縣水林鄉蕃薯社區發展協會
不定時全區環境整理、喬灌木及
設施巡視等工作。

定期維護

附件五

農村再生相關公共設施認養契約



一、設施名稱：運動公園
號：

二、坐落地點：1549、1564、1565-2及1616-1地號

三、土地所有權人：王清裕等人

四、申請認養者：蕃薯社區理事長吳世明

五、認養起迄期程：

六、平日清潔維護及管理計畫：雲林縣水林鄉蕃薯社區發展協會
雲林縣水林鄉蕃薯社區發展協會

此致

(管理財產機關)

認養單位(組織)：雲林縣水林鄉蕃薯社區發展協會或蓋章

統一編號：26836125

身分證統一編號或營業登記證號碼：

聯絡住址：雲林縣水林鄉蕃薯村45

聯絡電話：0919-804333

15

全民共同維護環境

施工單位報告



品管組織

廠商負責人

洪鳳凰

工地負責人

林聖諭

品管人員

林文振



安衛人員

林聖諭

測量人員

林聖諭

姓名	身分證號碼	出生日期	訓練單位	研討會、研習會或訓練名稱	研習日期	課程時數	認證時數及登記章
林聖諭	83.07.03	N125813970	台灣省工商安全衛生協會	第110001期「營造業職業安全衛生業務主管、安全衛生教育訓練班」	110.01.23	6小時	本訓練班經臺中市政府中華民國110年01月08日中市府檢字第1100000175號函同意備查(認可時數6小時) 有效期限：112.01.22(二年) 訓練專線：04-22060768





施工自主檢查管制總表

品質管制

抽驗項目	已抽驗次數	符合次數	未符合次數
施工放樣	4	4	0
開挖工程	3	3	0
模板工程	4	4	0
鋼筋工程	3	3	0
混凝土工程	4	4	0
鋪面工程	2	1	1(已改善)
仿木工程	7	4	3(已改善)
裝置藝術工程	2	2	0
砌陶磚工程	3	3	0
牆面美化工程	2	2	0
植栽工程	1	1	0
施工作業安全	9	9	0
一般安全衛生	9	9	0
工地環境保護	53	53	0
生態友善檢核	6	6	0



藝術牆牆身鋼筋檢查



仿木平台鋼構組立檢查



步道模板查驗



仿木平台鋼構組立檢查



仿木座椅鋼構檢查



仿木花架組立檢查

總計查驗
15項

抽查次數
112次

不合格
次數4次

合格次數
108次

合格率達
96%



防災與安全(1/2)

落實工地安全衛生管理



施工前職安宣導



工地周圍交維設置



出入口交維佈設



防疫自主確實落實



當日職安衛確實填寫





施工車輛沖洗



防災與安全(2/2)

工地防災及安全預防執行流程

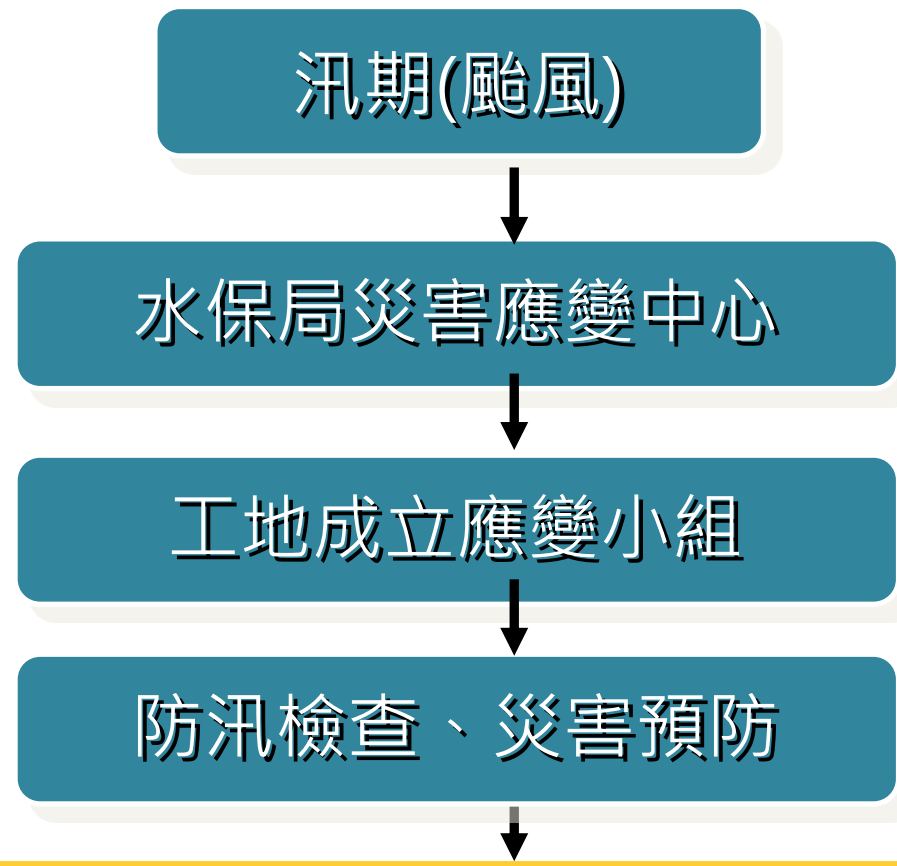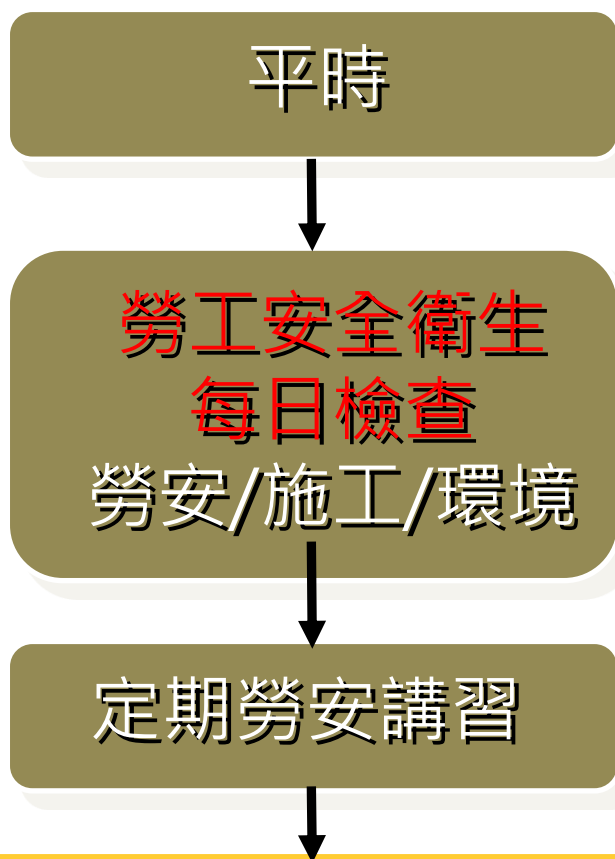


零工安事故、零災害



雙軸曲線

一體成形雙軸曲線漸變，施工細節不馬虎

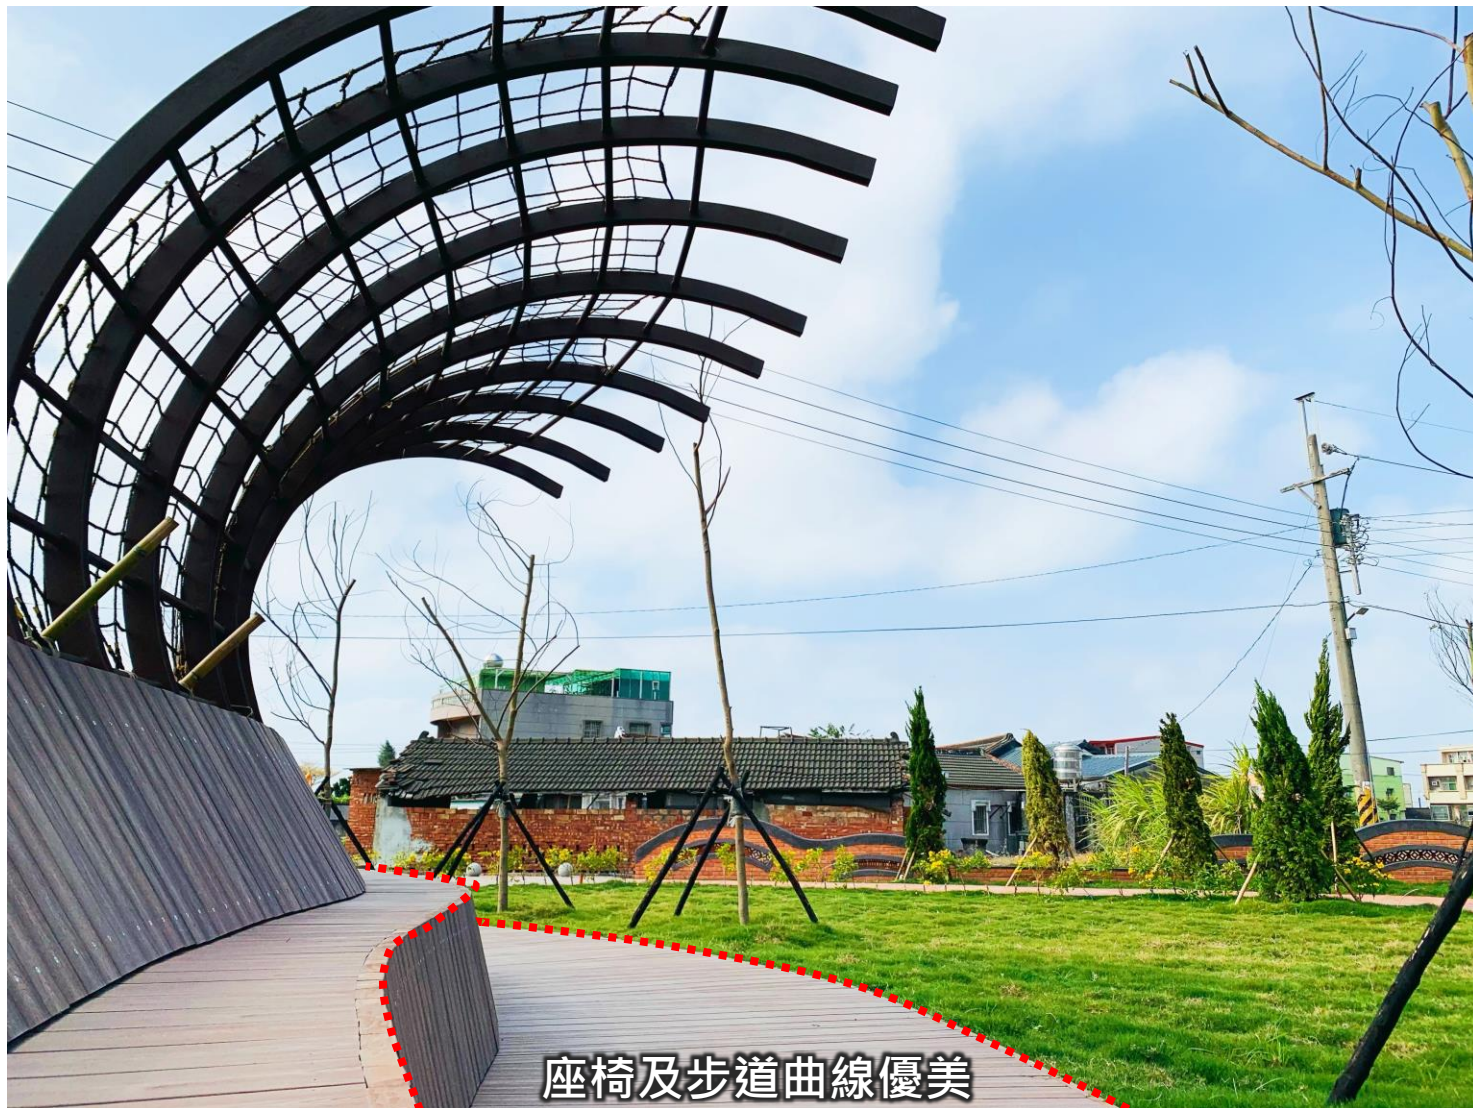

座椅及步道曲線優美



對齊一致

縱橫雙向漸變式
設計施工難度高



棧道面板配合弧線整板



全區弧形設計

精雕細琢慢工出細活



PART 05

工程效益



小花效應持續發酵

蕃薯社區景點

1. 憨吉秘塘
2. 西邊公園
3. 蕃薯寮媽故事彩繪牆
4. 圖書園
5. 憨吉古井花園
6. 蕃薯寮媽立體故事牆
7. 憨吉客棧
8. 咖啡園
9. 蕃薯東營公園
10. 憨吉田園鐵馬道
11. 順心園
12. 順心亭
13. 轉角愛亭
14. 秘密花園
15. 三角公園
16. 洪氏宗祠





休憩最佳場域



阿公帶孫安全場域





場所不設限，整個村都是我的遊樂場

施工前-社區窳陋空間

全齡場域營造-長者、孩童活動重要據點



渾然天成的古厝展示場





開鑿古井保存飲水思源



古井介紹

百年古井在這

慈吉
古井花園

施工後-古井重現


施工前-百年古井遺失



獲媒體報導提升機關形象

雲林水林鄉憨吉古井花園獲建築園冶獎肯定

新頭條 (2022-05-13 11:31)

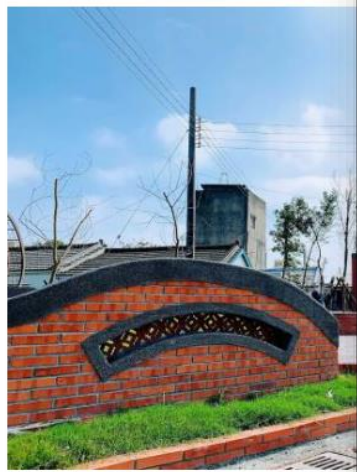

記者陳愛金 / 雲林報導

位於雲林縣水林鄉的蕃薯厝開發至今已有一百多年，官、律師及醫師等人才輩出，而有「狀元村」美譽的義工們為打造狀元村獨特的人文風貌，近來將多處閒置空地翻轉為多元功能的特色場域。在農業委員會水土保持局的協助下，成為雅趣之所在，也贏得2022建築園冶獎評審項。

自由時報 即時 熱門 政治 社會 生活 健康 國際 地方 寬奇 影音 財經 娛樂 藝文
汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 TAIPEI TIMES 求職

買電腦 最高享41%回饋
5/16-5/31 買Lenovo電腦 最高享41%回饋 PChome 24h服務

快訊 兩彈炸開！全台15縣市豪、大雨特報

首頁 > 生活

農村荒地變療癒美拍空間 水林「憨吉古井花園」奪園冶獎

水林蕃薯社區居民齊力改造社區閒置空地變憨吉古井花園，榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類肯定。
(圖由水保局提供)

2022/05/14 12:48

【記者黃淑莉／雲林報導】水林鄉蕃薯社區爭取水保局農村再生計畫，居民齊力參與把多處閒置雜亂的空地整理改造，打造成兼具歷史人文與自然風情的多功能場域，不僅康寧且很適合拍照，其中「憨吉古井花園」獲得2022建築園冶獎公共建築景觀類肯定。

蕃薯社區住在水林市區外圍，是典型農村，村民主要信仰中心「順天宮」主祀媽祖為瀾洲站最大媽，地方稱「蕃薯寮媽」。

社區理事長吳世明表示，社區法官、律師及醫師等人才輩出，有「狀元村」美譽，所以每逢考試季節來參拜蕃薯寮媽民眾絡繹不絕，但順天宮周邊多處閒置空地缺乏整理，加上公設設施不足情況，參拜民眾拜後即離開很可惜，社區爭取農村再生計畫，並進一步發動居民參與環境整理及景觀改造。



2022年榮獲建築園冶獎

AWARDS

雲林縣

公共、校園建築景觀類

社區文化景觀營造類






元宵夜巡活動空間延伸全村

元宵節順天宮盛況





完善社區導覽體驗遊程

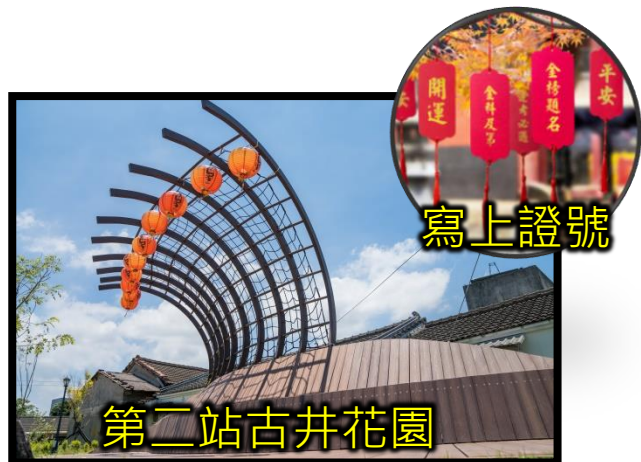

許願包內填寫考試證號，掛上去



遊客先到順天宮擲筊求筆及許願包



拿筆尖點狀元筆後
將姓名及目標掛上去祈福花架



帶動青年返鄉活化產業





帶動蕃薯村經濟效益

蕃薯社區-歷年成果



轉角愛亭：第一階段(進階)



圖書園：第二階段(銀牌獎)



憨吉客棧：第二階段(金牌獎)



順心亭：第一階段(進階)



➤ 蕃薯社區 黃金家常食譜
蕃薯糕、牛舌地瓜餅、養生地瓜甜煎餅、
風味手工珊瑚麵/火龍果麵、紫薯雪花糕、
奶香諸糕





報告完畢 敬請指教



行政院農業委員會水土保持局
與您一起打拼
